




PREŠOV 2030

Hodnotiaca správa

Vyhodnotenie plnenia
Akčného plánu PREŠOV 2030
na roky 2023 - 2025

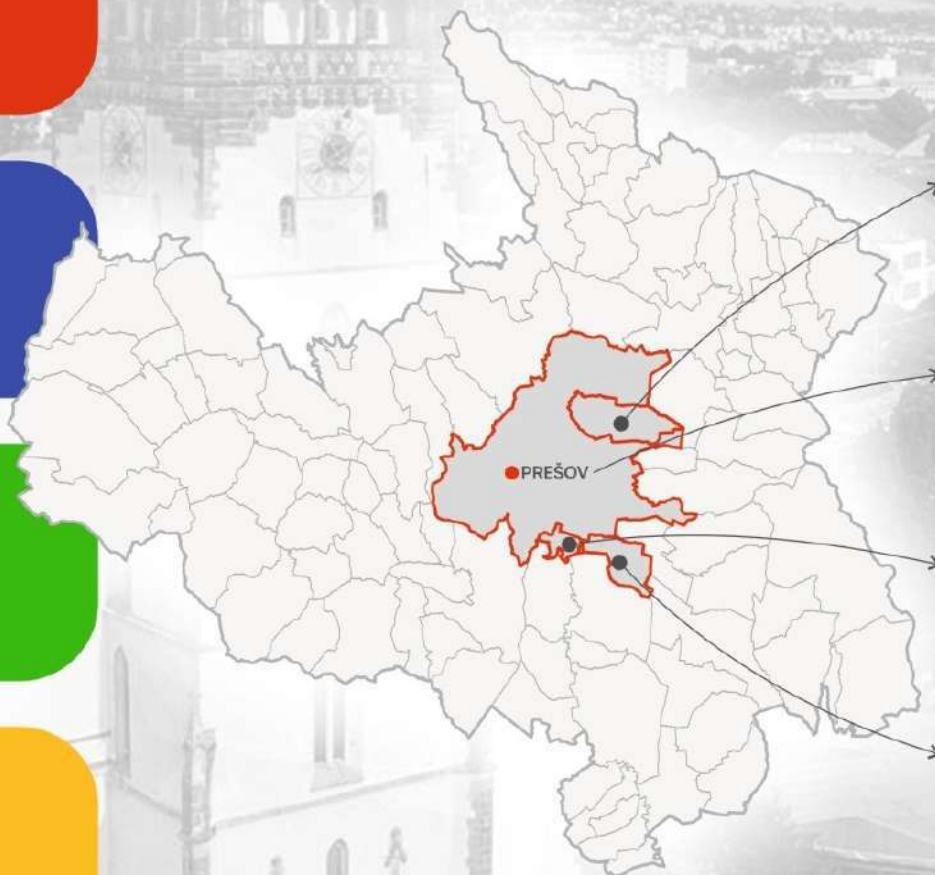

LUBOTICE



PREŠOV



HANISKA



ZÁBORSKÉ





Obsah

ÚVOD.....	2
ZHRNUTIE	7
MESTO PREŠOV	9
Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 za obdobie rokov 2023 – 2025	9
Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 - 2025 podľa prioritných oblastí.....	11
OBEC ĽUBOTICE	32
Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 za obdobie rokov 2023 – 2025	32
Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 - 2025 podľa prioritných oblastí.....	34
OBEC HANISKA	39
Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 za obdobie rokov 2023 – 2025	39
Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 - 2025 podľa prioritných oblastí.....	41
OBEC ZÁBORSKÉ	44
Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 za obdobie rokov 2023 – 2025	44
Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 - 2025 podľa prioritných oblastí.....	46
Zoznam použitých skratiek.....	51
Zoznam obrázkov, tabuliek a grafov	54

Názov	Hodnotiaca správa Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 na roky 2023 – 2025
Územné vymedzenie:	UMR Prešov
Dátum platnosti:	01.01.2023 – 30.06.2025
Publikovaný verejne:	2025





ÚVOD

Mesto Prešov spolu s obcami Haniska, Ľubotice a Záborské spracovali spoločný strategický dokument - Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2035 (ďalej len „PREŠOV 2030“).

Strategický dokument PREŠOV 2030

- je spracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ako základný strednodobý program rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja Prešov (ďalej len „UMR Prešov“),
- plní aj úlohu **Integrovannej územnej stratégie** - základného strategického nástroja pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného nástrojmi územnej implementácie fondov EÚ, ako sú integrované územné investície (v súlade s článkom 29 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2018/0196),
- je nástrojom pre využívanie **doplnkových zdrojov z fondov Európskej únie** v aktuálnom programovom období 2021 - 2027,
- **definuje dlhodobú víziu rozvoja územia UMR Prešov** - očakávaný stav rozvoja územia do roku 2035 za predpokladu, že budú využité príležitosti a potenciál rozvoja územia,
- **stanovuje 3 prioritné oblasti rozvoja územia UMR Prešov**, ktoré reprezentujú želané zmeny v kvalite života v rozvojovom území, konkrétne:

Obrázok 1 Priority a ciele



Proces spracovania strategického dokumentu bol časovo náročný - zahájený bol v decembri 2020 v súlade s príslušnou legislatívou, ako aj v súlade s metodickými usmerneniami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre tvorbu programových dokumentov pre programové obdobie 2021 - 2027 na regionálnej a miestnej





úrovni, ktoré sa v čase menili. **PREŠOV 2030 bol schválený Kooperačnou radou UMR Prešov dňa 27.06.2024, uznesením č. 11/2024 a následne zastupiteľstvami územných samospráv v decembri 2024.**

Napĺňanie stratégie PREŠOV 2030 prebieha v súlade s Akčným plánom PREŠOV 2030, ktorý bol schválený Kooperačnou radou UMR Prešov, uznesením č. 4/2024. Akčný plán predstavuje vykonávaciu časť k strategickému dokumentu PREŠOV 2030. Zostavený je v tabuľkovej forme podľa prioritných oblastí rozvoja a stanovených cieľov. Poskytuje prehľad intervencií - rozvojových aktivít a projektov, ktoré majú zadefinovaného nositeľa/gestora, indikatívny rozpočet, stav pripravenosti, merateľné ukazovatele predpokladaných výsledkov a možné zdroje financovania s využitím viaczdrojového financovania, vrátane fondov EÚ.

Hodnotiaca správa poskytuje odpočet napĺňania akčného plánu v období rokov 2023 - 2025 (k 30.06.2025). Štruktúra vyhodnotenia zodpovedá konceptu akčného plánu, ktorý bol spracovaný ako samostatná príloha k strategickému dokumentu PREŠOV 2030. Vyhodnotenie spracovali administratívne kapacity UMR Prešov na základe podkladov získaných od samospráv tvoriacich územie UMR Prešov a nositeľov/gestorov konkrétnych rozvojových aktivít/projektov.

Vyhodnotenie je spracované samostatne za každú obec UMR Prešov v nasledovnej štruktúre:

- **kvantitatívne vyhodnotenie dosiahnutých výstupov** za obdobie rokov 2023 - 2025 (k 30.06.2025), v tabuľkovej podobe,
- **stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov podľa priorít** za obdobie rokov 2023 - 2025 (k 30.06.2025), vrátane grafického vyjadrenia stavu plnenia v nasledovnej štruktúre:

Splnené – S	aktivity/projekty boli zrealizované
Priebežné plnenie – P	aktivity/projekty sa priebežne pripravujú a realizujú
Nesplnené - N	aktivity/projekty neboli zrealizované

Finančné plnenie je uvádzané sumárne pri aktivitách a projektoch, kde už bolo zrealizované čiastkové finančné plnenie (napr. náklady na spracovanie štúdií, projektových dokumentácií a pod.), prípadne realizácia projektu bola ukončená. V prípade, ak konkrétne aktivity/projekty prispievajú k plneniu viacerých cieľov, ich finančná náročnosť je uvádzaná iba pri nosnom projekte, aby nedochádzalo k duplicitnému vykazovaniu reálne




vynaložených výdavkov. **Merateľné ukazovatele v kvantitatívnom vyjadrení sú uvádzané len pri ukončených aktivitách a projektoch.**

V rámci UMR Prešov bolo na obdobie rokov 2023 – 2025 plánovaných celkom 167 rozvojových aktivít a projektov uvedených v Akčnom pláne PREŠOV 2030. V období od januára 2023 do júna 2025 bol stav plnenia nasledovný:

- **zrealizovaných a ukončených bolo 19 aktivít a projektov** - približne 11% z celkového plánovaného počtu;
- **priebežne sa realizuje 125 aktivít a projektov** - približne 75% z celkového plánovaného počtu;
- **nebolo zrealizovaných 23 aktivít a projektov** - približne 14% z celkového plánovaného počtu.

Detailnejší prehľad na stav plnenia plánovaných rozvojových aktivít a projektov za mesto Prešov a obce tvoriace UMR Prešov poskytuje nižšie uvedený graf 1.

Graf 1 Plnenie Akčného plánu PREŠOV 2030 k 30.06.2025

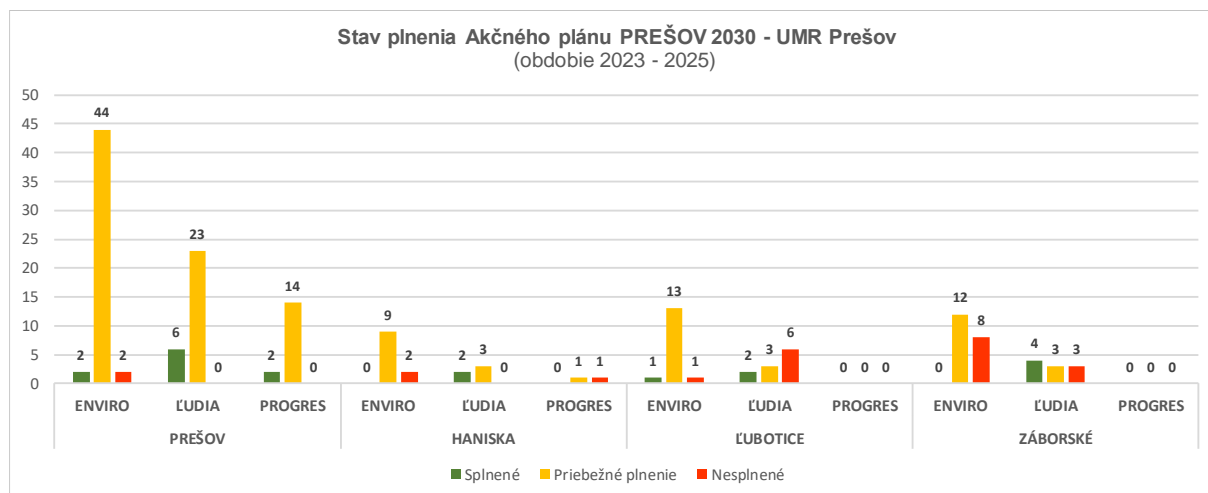

Stratégia PREŠOV 2030 je nástrojom pre využívanie zdrojov na rozvoj územia, vrátane zdrojov z fondov EÚ v aktuálnom programovom období 2021 - 2027 - plní aj úlohu Integrovannej územnej stratégie. Pre implementáciu integrovanej územnej stratégie (ďalej len „IÚS“) je v rámci Programu Slovensko (ďalej len „P_SK“), vyčlenených 38 opatrení/špecifických cieľov v 5 cieľoch politiky súdržnosti. Pre územie UMR Prešov bola z Programu Slovensko na obdobie 2021 – 2027 vyčlenená alokácia v objeme 52 992 172 € na napĺňanie stratégie prostredníctvom integrovaných územných investícií. V súlade s § 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ bola na potreby integrovaného územného rozvoja zriadená Kooperačná rada UMR Prešov, do kompetencie ktorej patrilo o. i. schvaľovanie projektových zámerov integrovaných územných investícií.





V období od 01.01.2023 do 30.06.2025 Kooperačná rada UMR Prešov schválila 34 projektových zámerov integrovaných územných investícií (ďalej len „PZ IÚI“), pričom celkové oprávnené výdavky (ďalej len „COV“) schválených PZ IÚI predstavovali 57 350 421,28 €. V priebehu prvého polroka 2025 došlo k stiahnutiu 2 PZ IÚI z objektívnych dôvodov.

Aktuálny stav k 30.06.2025

- Schválené PZ IÚI - 32 (po stiahnutí 2 PZ IÚI); COV - 43 910 749,78 €
- Podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) - 24
- Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku - 22 918 399,16 €
- Schválené ŽoNFP - 14 v celkovom objeme 12 069 732,40 €
- Uzatvorené zmluvy o NFP – 11, celková výška NFP 10 259 272,54 €
- Neschválené ŽoNFP - 1 (z dôvodu nedostatočnej alokácie pre špecifický cieľ)

Vo vzťahu k finančnej náročnosti PZ IÚI Kooperačná rada UMR Prešov k 30.06.2025 schválila PZ IÚI, ktorých finančná náročnosť predstavovala 69,13% alokácie vyčlenenej pre územie UMR Prešov. Nižšie uvedená tabuľka č. 1 poskytuje prehľad o schválených PZ IÚI, žiadateľoch, finančnej náročnosti PZ IÚI, stave procesovania ŽoNFP a príspevku PZ IÚI k napĺňaniu cieľov a priorít Stratégie PREŠOV 2030.

Viac informácií o schválených PZ IÚI v rámci UMR Prešov poskytuje „Mapa projektov“, link: <https://experience.arcgis.com/experience/febf7ff81aef4e4585b6441fcc1dc9cf?draft=true&org=mestopresov>.

Obrázok 2 Mapa projektov

Žiadateľ	Mesto Prešov
Cieľ projektu	Výbudovanie udržateľného modelu multimodálnej a ekologickej mobility v území
Opis projektu	Zámernom projektom je vybudovanie moderného terminálu, integrovaného mestského hromadného dopravného a prímestskej dopravy. Cieľom je modernizácia síť zastávky vozovka, chodníky, celková úroveň priestoru terminálu, zázemie pre cestujúcich a informačný systém terminálu. Modernizácia infraštruktúry sa zlepšila podmienky a prístupnosť pre všetkých občanov vrátane znevýhodnených osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Odstránenie bariér dôjde k zvýšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Vybúďuje sa informačný systém terminálu, čím sa zlepši informovanosť cestujúcich o príchodoch a odchodoch spojov jednotlivých druhov verejnej dopravy poskytovaných v cudzích jazykoch a pre nevidiacich. Cieľom projektu je dosiahnuť



HODNOTIACA SPRÁVA 2023 - 2025

Tabuľka 1 Prehľad schválených projektových zámerov integrovaných územných investícií k 30.06.2025

KR	P.č.	Názov PZ IÚI	Žiadateľ	Schválenie PZ IÚI	COV - PZ IÚI	ŽoNFP - aktuálny stav	Napĺňanie stratégie
27.06.2024	1	Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov	Mesto Prešov	27.06.2024	4 603 512,66 €	Uzavretá Zmluva o NFP	P1, SC - 1.2, ŠC - 1.2.1
	2	Pohybom k spájaniu komunít - multišportová zóna Prešov	Mesto Prešov	27.06.2024	571 648,42 €	Uzavretá Zmluva o NFP	P2, SC - 2.2, ŠC - 2.2.2
	3	Mestské opevnenie hradobný múr - 1. etapa	Mesto Prešov	27.06.2024	425 620,97 €	Uzavretá Zmluva o NFP	P3, SC - 3.2, ŠC - 3.2.3
	4	Škola v spojení s prírodou - ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja	Mesto Prešov	27.06.2024	355 282,78 €	Uzavretá Zmluva o NFP	P2, SC - 2.1, ŠC - 2.1.1
	5	Škola v spojení s prírodou - ZŠ Sibírska	Mesto Prešov	27.06.2024	270 292,90 €	Uzavretá Zmluva o NFP	P2, SC - 2.1, ŠC - 2.1.1
	6	Škola v spojení s prírodou - ZŠ Šmeralová	Mesto Prešov	27.06.2024	210 472,83 €	Uzavretá Zmluva o NFP	P2, SC - 2.1, ŠC - 2.1.1
	7	Škola v spojení s prírodou - ZŠ Šrobárová	Mesto Prešov	27.06.2024	271 675,65 €	Uzavretá Zmluva o NFP	P2, SC - 2.1, ŠC - 2.1.1
	8	Škola v spojení s prírodou - ZŠ Mírka Nešpora	Mesto Prešov	27.06.2024	368 403,36 €	Uzavretá Zmluva o NFP	P2, SC - 2.1, ŠC - 2.1.1
					SPOLU COV	7 076 909,57 €	
05.09.2024	9	Tvorba mestskej inovačnej stratégie pre zvýšenie inovačnej konkurencieschopnosti UMR Prešov s cieľom zelenej, digitálnej a udržateľnej transformácie územia	Mesto Prešov	05.09.2024	1 730 000,61 €	Po doplnení	P3, SC - 3.1, ŠC - 3.1.1
	10	Zavádzanie IoT smart riešení	Mesto Prešov	05.09.2024	3 600 634,71 €	Po doplnení	P3, SC - 3.1, ŠC - 3.1.2
	11	Obnova ČOV v ZpS Harmónia, Cemjata	Mesto Prešov	05.09.2024	430 260,00 €	Uzavretá Zmluva o NFP	P2, SC - 2.2, ŠC - 2.2.1
	12	Revitalizácia zelene	Obec Záborské	05.09.2024	267 425,00 €	ŽoNFP schválená	P1, SC - 1.2, ŠC - 1.2.1
	13	Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská	Mesto Prešov	05.09.2024	2 377 051,68 €	ŽoNFP schválená	P1, SC - 1.1, ŠC - 1.1.1
	14	Most na ulici Pod Hrádkom - realizácia	Mesto Prešov	05.09.2024	1 003 505,68 €	Rozpracovaná	P1, SC - 1.1, ŠC - 1.1.1
					SPOLU COV	9 408 877,68 €	
28.11.2024	15	Obnova fasády budovy evanjelickej spojenej školy v Prešove	ECAV	06.02.2025	475 315,71 €	ŽoNFP schválená	P3, SC - 3.2, ŠC - 3.2.3
	16	Rekonštrukcia nádvoria Čierneho orla	Mesto Prešov	28.11.2024	923 951,92 €	Rozpracovaná	P3, SC - 3.2, ŠC - 3.2.3
	17	Revitalizácia stromoradií a kvitnúcich záhonov v meste Prešov	Mesto Prešov	28.11.2024	234 970,95 €	Uzavretá Zmluva o NFP	P1, SC - 1.2, ŠC - 1.2.1
	18	Srdce Šidlovca - komunitné a pastoračné centrum Prešov - Šidlovec	RKC	28.11.2024	856 158,11 €	Na doplnení	P3, SC - 3.2, ŠC - 3.2.3
	19	Reštaurátorské práce exteriéru veže objektu Konkatedrálneho kostola sv. Mikuláša v Prešove	RKC	28.11.2024	1 474 032,00 €	Rozpracovaná	P3, SC - 3.2, ŠC - 3.2.3
	20	Znižovanie energetickej náročnosti objektu MŠ Zemplínska 2, Prešov	Mesto Prešov	06.02.2025	1 079 817,20 €	Na doplnení	P1, SC - 1.1, ŠC - 1.1.2
	21	Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ prof. M. Podhájeckej	Mesto Prešov	06.02.2025	1 131 021,00 €	Na doplnení	P1, SC - 1.1, ŠC - 1.1.2
	22	Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Jurkovičova	Mesto Prešov	06.02.2025	1 772 798,50 €	Na doplnení	P1, SC - 1.1, ŠC - 1.1.2
	23	Podpora energetickej efektívnosti - ZŠ Československej armády 22	Mesto Prešov	06.02.2025	2 570 161,47 €	Na doplnení	P1, SC - 1.1, ŠC - 1.1.2
	24	Dostupnosť - Inklúzia - Kvalita ZŠ v Ľuboticiach	Obec Ľubotice	28.11.2024	763 435,98 €	Neschválená	P2, SC - 2.1, ŠC - 2.1.1
					SPOLU COV	11 281 662,84 €	
06.02.2025	25	Revitalizácia Kolmanovej záhrady prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry	ECAV Prešov	06.02.2025	565 534,54 €	PZ IÚI stiahnutý	P1, SC - 1.2, ŠC - 1.2.1
	26	Obnova, modernizácia a sprístupnenie Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa a Biskupského paláca v Prešove pre rozvoj kultúrneho cestovného ruchu	GKA Prešov	06.02.2025	1 340 828,43 €	Rozpracovaná	P3, SC - 3.2, ŠC - 3.2.3
	27	Obnova komunitného centra Gréckokatolíckej farnosti v Prešove	GKA Prešov	06.02.2025	308 954,48 €	Rozpracovaná	P3, SC - 3.2, ŠC - 3.2.3
	28	Kvalitnú šport. infraštruktúrou vytvoriť vhodné podmienky pre pohybové aktivity a zdravý životný štýl	Obec Ľubotice	06.02.2025	1 002 073,14 €	Uzavretá Zmluva o NFP	P2, SC - 2.2, ŠC - 2.2.2
		Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarň - 1. etapa	Mesto Prešov	06.02.2025	12 874 136,96 €	PZ IÚI stiahnutý	P1, SC - 1.1, ŠC - 1.1.1
	29	Komplexná obnova NKP na Hlavnej č. 72, pre potreby zvýšenia potenciálu cestovného ruchu	Mesto Prešov	06.02.2025	1 099 839,30 €	Rozpracovaná	P3, SC - 3.2, ŠC - 3.2.3
	30	Obnova národnej kultúrnej pamiatky Caraffova väznica pre rozvoj kultúry v meste Prešov	Mesto Prešov	06.02.2025	996 342,71 €	Rozpracovaná	P3, SC - 3.2, ŠC - 3.2.3
	31	Výbudovanie malého amfiteátra v campuse Prešovskej univerzity	Universitates, n.o.	06.02.2025	267 134,06 €	Po doplnení	P3, SC - 3.2, ŠC - 3.2.3
	32	Výbudovanie viacúčelového športoviska v areáli Prešovskej univerzity	Prešovská univ.	06.02.2025	215 038,97 €	Zaregistrovaná	P2, SC - 2.2, ŠC - 2.2.2
						SPOLU COV	18 669 882,59 €
22.05.2025	33	Podpora intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov v Prešove	TSmP, a.s.	22.05.2025	446 310,59 €	Rozpracovaná	P1, SC - 1.2, ŠC - 1.2.2
	34	Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarň - 1. etapa	DPMP, a.s.	22.05.2025	10 466 778,01 €	Rozpracovaná	P1, SC - 1.1, ŠC - 1.1.1
					SPOLU COV	10 913 088,60 €	
					CELKOM	57 350 421,28 €	



ZHRNUTIE

Na reálne plnenie plánovaných rozvojových aktivít a projektov stratégie PREŠOV 2030 mali vplyv viaceré faktory, konkrétne:



- **pokles príjmov z podielových daní** - zmeny v štátnych politikách spôsobili výpadky v príjmoch samospráv, ktoré neboli v plnej miere kompenzované štátom,
- **rast výdavkov spojený so zvýšením sadzby DPH** sa premietol do zvýšených nákladov na nákup tovarov a služieb, ktoré samosprávy potrebujú na svoju prevádzku, na zabezpečenie základných služieb pre občanov a aj na realizáciu plánovaných rozvojových projektov,
- **financovanie preneseného výkonu štátnej správy** - v mnohých prípadoch nie je dostatočné, samosprávy musia doplácať výkony z vlastných rozpočtov, čo eliminuje finančné zdroje plánované na vlastné rozvojové projekty,
- **procesy spojené s čerpaním EÚ zdrojov** - výzvy v rámci programovacieho obdobia 2021 – 2027 boli vyhlasované s výrazným oneskorením (až v druhom polroku 2024), v predstihu (pred vyhlásením výziev) nebolo možné jednoznačne definovať oprávnenosť žiadateľov, aktivít či konkrétnych typov výdavkov, čo malo vplyv na pripravenosť projektov.

V záujme zachovania aktuálnosti vykonávacej časti strategického dokumentu, ako aj jeho flexibility vo vzťahu k dosahovaniu stanovených cieľov, je potrebné zabezpečiť aktualizáciu Akčného plánu PREŠOV 2030 na obdobie rokov 2026 – 2027.

Proces aktualizácie bude založený na zapracovaní podnetov samospráv, ako aj všetkých relevantných subjektov pôsobiacich na území UMR Prešov a reflektovaní možných príležitostí, ohrození a nových skutočností, ktoré neboli známe pri zostavovaní stratégie PREŠOV 2030 a jej vykonávacieho dokumentu.

Je potrebné zdôrazniť, že **mnohé rozvojové aktivity a projekty** definované v Akčnom pláne PREŠOV 2030 na obdobie rokov 2023 - 2025 **sú z procesného, časového aj finančného hľadiska veľmi náročné** (procesy spojené so spracovaním projektovej dokumentácie; majetkovo-právne vysporiadanie; stavebné konanie; získavanie EÚ zdrojov - príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok, schvaľovanie žiadosti a uzatváranie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela či dodávateľa tovarov a služieb, vrátane kontroly a pod.), do monitorovaného obdobia sa ich nepodarilo zrealizovať z objektívnych dôvodov a ich príprava, resp. realizácia bude prebiehať aj v nasledujúcom období - **budú premietnuté aj do Akčného plánu PREŠOV 2030 na obdobie rokov 2026 - 2027.**

Naopak, mnohé **aktivity a projekty, ktoré neboli zrealizované z objektívnych dôvodov** (vysoká finančná náročnosť, nedostatok odborných kapacít, neaktuálnosť





realizácie z hľadiska obsahového zamerania a pod.) **už do Akčného plánu PREŠOV 2030 na obdobie rokov 2026 - 2027 nebudú zahrnuté.**

Taktiež je potrebné uviesť, že **v rokoch 2023 - 2025 bolo vygenerovaných množstvo nových projektov**, ktoré majú vysokú opodstatnenosť a **výrazne prispievajú k napĺňaniu stratégie PREŠOV 2030, preto budú zaradené aj do pripravovaného Akčného plánu na obdobie rokov 2026 - 2027.**

Zodpovednosť za proces aktualizácie Akčného plánu PREŠOV 2030 na obdobie rokov 2026 - 2027 nesú Administratívne kapacity UMR Prešov.





Mesto Prešov

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030
za obdobie rokov 2023 - 2025

**MESTO PREŠOV****Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 za obdobie rokov 2023 – 2025**


Tabuľka 2 Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – mesto Prešov

MESTO PREŠOV							
Priorita	Špecifický cieľ	Počet intervencií*				Finančná náročnosť	
		Celkovo	Splnené	Priebežné plnenie	Nesplnené	Indikatívny rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2025
1 – ENVIRO Udržateľné a odolné prostredie	ŠC 1.1.1 - Doprava	21	2	18	1	110 285 288,17 €	12 595 745,77 €
	ŠC 1.1.2 - Energetika	8	0	8	0	12 108 163,61 €	2 007 659,89 €
	ŠC 1.2.1 - Klíma	12	0	11	1	14 007 799,48 €	247 418,00 €
	ŠC 1.2.2 - Odpad	7	0	7	0	6 512 086,84 €	656 516,62 €
	SPOLU	48	2	44	2	142 913 338,10 €	15 507 340,28 €
2 – ĽUDIA Služby pre dôstojný život	ŠC 2.1.1 - Vzdelávanie	7	0	7	0	6 389 593,75 €	3 972 580,00 €
	ŠC 2.1.2 - Práca	3	0	3	0	1 183 489,31 €	1 425 296,46 €
	ŠC 2.2.1 - Sociálne a zdravotnícke služby	7	2	5	0	7 015 610,00 €	2 141 815,83 €
	ŠC 2.2.2 - Šport	9	4	5	0	30 001 813,34 €	26 395 048,48 €
	ŠC 2.2.3 - Bezpečnosť	3	0	3	0	1 435 037,72 €	116 909,86 €
	SPOLU	29	6	23	0	46 025 544,12 €	34 051 650,63 €
3 – PROGRES Strategický rozvoj a dobré spravovanie	ŠC 3.1.1 - Kapacity	4	0	4	0	2 632 000,00 €	778 206,11 €
	ŠC 3.1.2 - Digitalizácia	4	1	3	0	4 750 000,00 €	98 516,00 €
	ŠC 3.1.3 - Spolupráca	2	0	2	0	1 800 000,00 €	0,00 €
	ŠC 3.2.1 - Inovácie	1	0	1	0	0,00 €	0,00 €
	ŠC 3.2.2 - Kultúrny a kreatívny priemysel	1	0	1	0	500 000,00 €	14 146,80 €
	ŠC 3.2.3 - Podnikanie	4	1	3	0	3 642 254,46 €	401 335,30 €
	SPOLU	16	2	14	0	13 324 254,46 €	1 292 204,21 €
CELKOM	93	10	81	2	202 263 136,68	50 851 195,12	


* Intervencia = konkrétna rozvojová aktivita / projekt



Graf 2 Prehľad plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – mesto Prešov

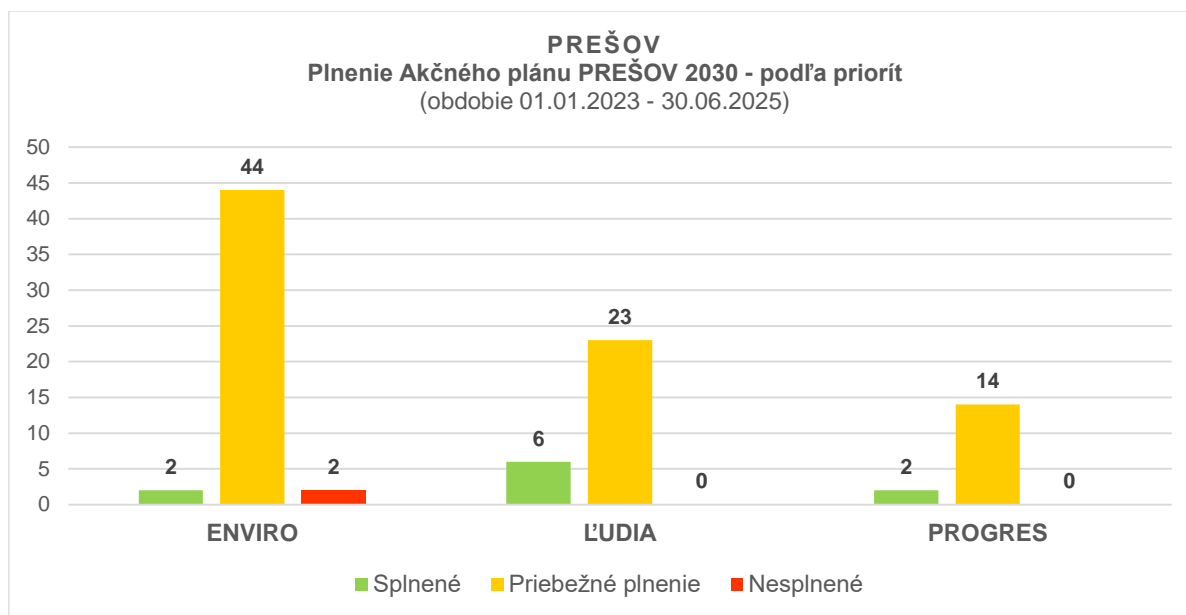

Graf 3 Percentuálne vyjadrenie plnenia plánovaných aktivít Akčného plánu PREŠOV 2030 – mesto Prešov

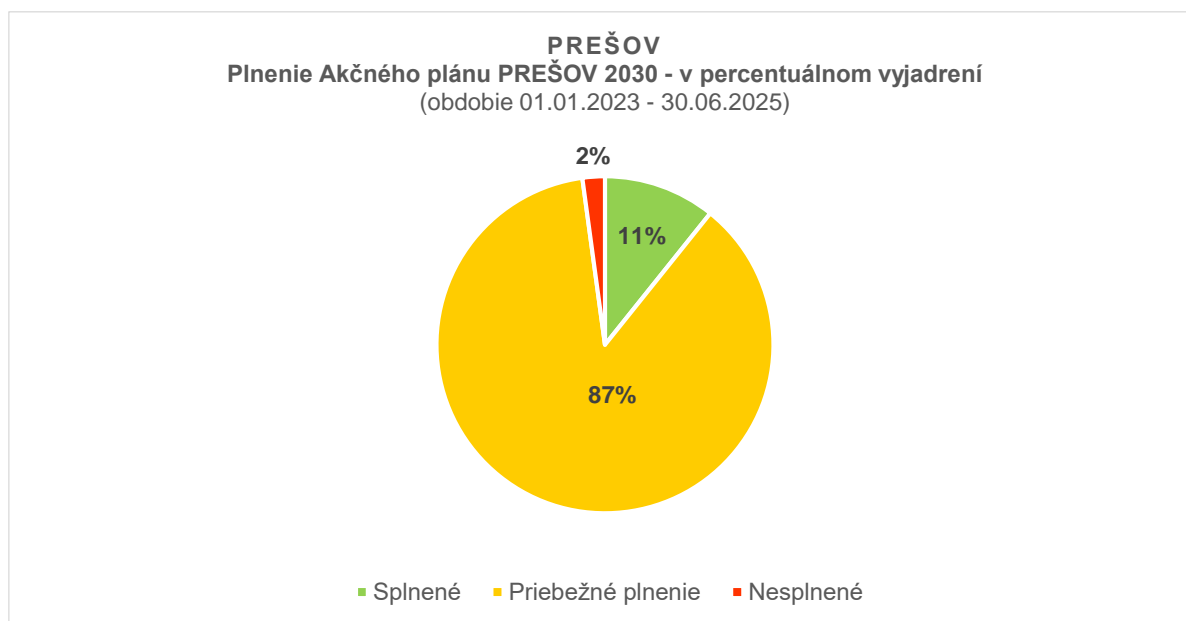

Mesto Prešov sa v rokoch 2023 - 2025 v najväčšom rozsahu venovalo príprave a realizácii rozvojových aktivít a projektov zameraných na budovanie udržateľného a odolného prostredia (dopravné projekty, projekty na ochranu prírody a adaptáciu na nepriaznivé zmeny klímy, projekty zamerané na znižovanie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a i.), skvalitnenie služieb pre občanov (sociálne služby, vzdelávacia infraštruktúra, vytváranie podmienok pre zdravý životný štýl, a i.) a digitálnej transformácii. Mesto **plánovalo realizáciu celkom 93 rozvojových aktivít a projektov**. K 30.06.2025 je **zrealizovaných celkom 11% projektov v hodnote cca 33,5 mil. €, v štádiu rozpracovanosti je 87 % intervencií** (prebieha projektová príprava, majetkovo-právne vysporiadanie, verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela a pod.) a **2 % intervencií sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať**.





MESTO PREŠOV

Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 - 2025 podľa prioritných oblastí

Tabuľka 3 Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 – 2025 podľa prioritných oblastí – mesto Prešov

PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu, udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky									
Špecifický cieľ: 1.1.1 Vybudovať udržateľný model multimodálnej a ekologickej mobility									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Severný obchvat mesta Prešov II. etapa (úsek Prešov, sever - Kapušany)	NDS, a.s.				Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Do stavu sumarizácie výstupov mesto Prešov neobdržalo spätnú väzbu.	
2	Prípojenie juhovýchodného obchvatu mesta Prešov na rýchlostnú cestu R4 a cestu III. triedy III/3431	SÚC PSK	1 200 000,00 €		Rozpočet PSK Štátny rozpočet P_SK – Opatrenie 3.2.3	Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Prebieha investičná príprava.	
3	Privádzač Grófske	PSK / SÚC PSK	50 000 000,00 €		Rozpočet PSK Štátny rozpočet EÚ zdroje	Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Vypracovaná technická štúdia (plánovaná dĺžka vybudovaných komunikácií - 1,52 km).	
4	Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy	PSK / SÚC PSK	75 000 000,00 €		Rozpočet PSK Štátny rozpočet EÚ zdroje	Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Vypracovaná technická štúdia, ukončené zisťovacie konanie, prebieha realizácia PD v stupni DUR/stavebný zámer (plánovaná dĺžka vybudovaných komunikácií - 8,68 km).	
5	Rekonštrukcia cesty III/3440 Solivarská ulica, III. etapa	SÚC PSK	2 125 000,00 €	3 261 133,60 €	EÚ zdroje - IROP P_SK - Opatrenie 3.2.3 Rozpočet PSK	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných komunikácií (km)	0,4567	PZ IÚI schválený RP PSK: 1. etapa (most) - zrealizovaná, 2. etapa - proces pozastavený (z dôvodu prebiehajúcich povoľovacích procesov a finančného krytia), potreba preschválenia PZ IÚI, 3. etapa - vydané SP, ukončené VO na zhotovenie diela.	
6	Preložka cesty I/68	Slovenská správa ciest				Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Slovenská správa ciest nezaradila v minulosti predmetnú stavbu do svojho investičného plánu. Dôvodom bol nesúhlas s trasou, resp. odmietnutie prevzatia trasy aj z dôvodu finančnej náročnosti.	
7	Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov - Lesík delostrelcov	SÚC PSK Mesto Prešov	3 400 000,00 €	4 076 310,43 €	P_SK - DoV Rozpočet PSK Rozpočet mesta	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných komunikácií (km)	0,1	Stavba zrealizovaná (mesto Prešov vynaložilo na rekonštrukciu 135 258,82 €).	S

Vyššie uvedený prehľad sumarizuje projekty strategického významu s kľúčovým dopadom na rozvoj územia nielen na miestnej úrovni, ale aj na regionálnej a národnej. Realizácia tohto typu projektov nie je v gescii mesta Prešov, resp. organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Príprava tohto typu projektov je procesne, finančne aj časovo veľmi náročná, napriek tomu je možné konštatovať, že jeden projekt je už zrealizovaný a 4 projekty sú realizované priebežne.



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu, udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky									
Špecifický cieľ: 1.1.1 Vybudovať udržateľný model multimodálnej a ekologickej mobility									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
8	Plán dopravnej obsluhy v meste Prešov	OD ORA IDS Východ	200 000,00 €		P_SK - Opatrenie 5.1.1 Rozpočet mesta	Počet spracovaných dokumentov		IDS Východ - príprava vymedzenia predmetu zákazky. PDO bude súčasťou PZ IÚI "KAPA - kapacity pre partnerstvá a participáciu", predpoklad predloženia PZ IÚI - 09/2025.	P
9	Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne	DPMP, a.s.	38 753 000,00 €		EÚ zdroje - DoV/MD SR Rozpočet DPMP, a.s.	Počet vybudovaných a modernizovaných technických základní na opravu a údržbu vozového parku verejnej osobnej dopravy		Predmetom a hlavným cieľom realizácie projektu je modernizácia a dobudovanie aktuálne zastaralej údržbovej základne trolejbusov, čím budú vytvorené potrebné podmienky pre údržbu súčasnej kapacity vozidlového parku trolejbusov a parciálnych trolejbusov, ako aj výhľadovo rozšíreného počtu nových vozidiel. Realizáciou projektu sa vytvoria vhodné technické a technologické podmienky pre kvalitnú údržbu a opravy nových nízkopodlažných vozidiel s cieľom zabezpečenia ich plnej prevádzkyschopnosti. Projekt je v štádiu prípravy ŽoNFP, prípravy VO na zhotoviteľa stavby a stavebného dozoru. Pozn.: Celková výška plánovaných oprávnených výdavkov ponížená na sumu 37 991 330,21 €	P
10	Modernizácia trolejbusových tratí - projektová dokumentácia	ORA	1 426 719,60 €		P_SK - Opatrenie 2.8.1	Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitoríngom a hodnotením		Spracované vymedzenie predmetu zákazky, potrebná aktualizácia špecifikácie úsekov, ktoré je potrebné modernizovať, predpoklad schválenia PZ IÚI KR UMR Prešov - 09/2025, predpokladané celkové výdavky na projekt – 1 564 755,16 €	P
11	Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarí	DPMP, a.s.	24 005 507,47 €	1 267 140,00 €	P_SK - Opatrenie 2.8.1 Rozpočet mesta	Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy Dĺžka nových trolejbusových tratí		Projekt "Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarí" je rozdelený na 3 etapy: 1. Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarí - 1. etapa — 22.05.2025 PZ IÚI schválený KR UMR Prešov (predpokladané celkové výdavky na projekt - 10 466 778,01 €), ZoD na dodávku projekčných, inžinierskych a iných súvisiacich služieb - 1 267 140,00 € 2. Výstavba nového trolejového vedenia MHD, Obratisko Levočská - Clementisova 3. Výstavba 2 meniarí pre trolejbusovú MHD (Solivarská, Čapajeva).	P
12	Nákup parciálnych trolejbusov - I. etapa	DPMP, a.s.	16 450 000,00 €	669 737,97 €	EÚ zdroje - DoV/MD SR Rozpočet DPMP, a.s.	Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (elektrický, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou	1	V rámci projektu bola plánovaná kúpa 10 ks trolejbusov (4 ks nízkopodlažných 12 m trolejbusov, 6 ks nízkopodlažných 18 m trolejbusov), avšak skrz termínových posunov a komplikácií počas VO, bol realizovaný znížený počet: 1 kus 18 m parciálny nízkopodlažný trolejbus. Pozn.: Celková výška plánovaných oprávnených výdavkov ponížená na sumu 669 737,96 €.	S



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE

STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu, udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky

Špecifický cieľ: 1.1.1 Vybudovať udržateľný model multimodálnej a ekologickej mobility

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
13	Modernizácia CDS so zameraním na preferenciu VOD	ORA	4 000 000,00 €	18 360,00 €	P_SK - Opatrenie 2.8.1 Rozpočet mesta	Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy		Projekt "Modernizácia SSZ pre potreby preferencie na križovatkách s centrálnym dispečingom" - aktualizovaná PD - riešenie VOD na celom území mesta Prešov, prebiehajú povolovacie procesy, predpokladané celkové výdavky na projekt - 5 975 051,87 €, predpoklad schválenia PZ IÚI v KR UMR Prešov - 09/2025.	P
14	Preferencia verejnej dopravy pomocou BUS pruhov	OD	250 000,00 €		P_SK - Opatrenie 2.8.1 Rozpočet mesta	Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy		Plán preferencie VOD spracovaný, zavedenie BUS pruhov do doby realizácie R4 nemá opodstatnenie, keďže by mohlo viesť k tvorbe dopravných kolón, v súčasnosti sa realizujú iné dopravné opatrenia.	N
15	Modernizácia odbavovacieho, informačného a dispečerského systému DPMP, a.s.	DPMP, a.s.	2 500 000,00 €		P_SK - Opatrenie 2.8.1 Rozpočet mesta	Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy		ZoNFP na projekt "Modernizácia odbavovacieho, informačného a dispečerského systému DPMP, a.s. bola neschválená – 651 827,41 € Súčasť PZ IÚI "Modernizácia SSZ pre potreby preferencie na križovatkách s centrálnym dispečingom".	P
16	Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská	ORA	1 989 460,12 €	16 200,00 €	P_SK - Opatrenie 2.8.1 Rozpočet mesta	Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy		PZ IÚI schválený KR UMR Prešov 28.11.2024, prebieha VO, schválená ZoNFP, predpokladané celkové výdavky na projekt – 2 457 235,06 €.	P
17	Ústredňa riadenia dopravy a strategické detektory	RIA mesta Prešov, n.o.	500 000,00 €		P_SK - Opatrenie 2.8.1 Rozpočet mesta	Veľkomestá a mestá s novými alebo modernizovanými digitalizovanými systémami mestskej dopravy		Súčasť PZ IÚI "Modernizácia SSZ pre potreby preferencie na križovatkách s centrálnym dispečingom" – 1 810 166,39 €.	P
18	Záchytné parkoviská	Mesto Prešov FTA, s.r.o.	150 000,00 €	68 379,12 €	EÚ zdroje - DoV Rozpočet mesta	Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy (PM)	48	• Parkovisko Björnsonova - špeciálny režim, súčasť stavby FTA • Uzatvorená zmluva s COOP Jednota (záchytné parkovisko bude realizované zo zdrojov COOP Jednota).	P
19	Nákup parciálnych trolejbusov II. etapa	DPMP, a.s.	9 600 000,00 €	5 355 482,50 €	EÚ zdroje - DoV/MD SR Rozpočet DPMP, a.s.	Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (elektricky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou	9	Kúpa 9 kusov parciálnych trolejbusov (5 kusov 18 m parciálnych nízkopodlažných trolejbusov a 4 kusy 12 m parciálnych nízkopodlažných trolejbusov).	S
20	Most nad riekou Torysa na ul. Jána Pavla II. v Prešove	ORA	5 000 000,00 €	126 408,00 €	EÚ zdroje - REACT Úverové zdroje	Počet opravených mostných objektov		PD (refundovaná z REACT - EÚ - 59 988,00 €), DRS - 66 420,00 €, vydané SP, predpoklad ukončenia VO na stavebné práce - 08/2025, predpokladané celkové výdavky na projekt – 7 595 908,14 €, Pozn.: celková dĺžka zrekonštruovaného úseku bude 317,72 m, pričom sa realizuje aj preložka cyklistickej cestičky EUROVELO 11 - 100,22 m.	P



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE

STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu, udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky

Špecifický cieľ: 1.1.1 Vybudovať udržateľný model multimodálnej a ekologickej mobility

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
21	Most na ulici Pod Hrádkom v Prešove	ORA	745 076,07 €	32 189,48 €	EÚ zdroje - REACT - EÚ P_SK - Opatrenie 3.2.4 Rozpočet mesta	Počet opravených mostných objektov		PD (refundovaná z REACT – EÚ - 32 189,48 €), proces VO na stavebné práce prebieha do 07/2025, vydané SP, PZ IÚI schválený KR UMR Prešov 05.09.2024, rozpracovaná ŽoNFP, predpokladané celkové výdavky na projekt – 1 065 871,11 €. Pozn.: Realizáciou projektu sa zrekonštruuje 0,034 km mostného objektu.	P
22	Rekonštrukcia a modernizácia mostných objektov	ORA	1 040 000,00 €	248 550,02 €	Rozpočet mesta Úverové zdroje	Počet opravených mostných objektov	1	Zrealizované stavby: • Lávka Suvorovova (zrealizovaných 15 m lávky) Realizované / Pripravované stavby: • Rekonštrukcia mosta v Nižnej Šebastovej (PD, prebieha VO na zhotoviteľa stavby) • Most nad riekou Torysa na Bajkalskej ulici (PD) • Rekonštrukcia mostov na ul. Požiarnická (PD)	P
23	Modernizácia miestnych komunikácií	ORA PSK	666 804,91 €	1 620 041,93 €	EÚ zdroje - IROP Plán obnovy a odolnosti Rozpočet mesta	Dĺžka zrekonštruovaných alebo modernizovaných miestnych komunikácií (km)	2,79	Zrealizované stavby: • Komunikácia M. Murgaša • Rekonštrukcia komunikácie ul. 17. novembra • Rekonštrukcia a odvodnenie MK ul. Kúty 3A - 21 • Oprava ciest a chodníkov ul. Čapajevova, Björnsonova Realizované / Pripravované stavby: • Rekonštrukcia ul. Slovenskej (príprava súťaže návrhov) • Rozšírenie ul. Urxova - prístup, komunikácia k Mestskému cintorínu (príprava PD) • Vnútroblok Jurkovičova - úprava komunikácie a parkovania (príprava PD) • Cesta Pavlovičovo námestie č. 42 - 45 (PD)	P



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE

STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu, udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky

Špecifický cieľ: 1.1.1 Vybudovať udržateľný model multimodálnej a ekologickej mobility

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
24	Regulácia parkovania na území mesta Prešov	OD ORA	500 000,00 €	1 187 636,75 €	Rozpočet mesta	Počet vytvorených parkovacích zón	6	Zrealizované stavby: <ul style="list-style-type: none">Sabinovská ul. BD č. 23Parkovisko Hollého ulicaPavlovičovo námestie č. 22 a 45Parkovisko Tomášikova ul. BD č. 15 - 56Pavlovičovo námestie č. 29 - 31Parkovisko ul. Lesnícka medzi bytovkami – 2 etapaMarka Čulena 42 - 50Baštová ul. č. 1 - 7, vnútroblok Realizované / Pripravované stavby: <ul style="list-style-type: none">Ul. Lesík delostrelcov 25 - 31Parkovisko na ul. Požiarnickej, ul. Záhradná č. 1 - 3Park. miesta areál ZŠ Bernolákova – na Šoltésovej ul.ZŠ Májové námestie (parkovisko)Ul. Federátov č. 1 - 7Vnútroblok JurkovičovaVolgogradská 66 - 88 Po zavedení regulácie statickej dopravy v Zónach č. 1, 2, 3, 6 a časti Zóny č. 4 prevádzkovateľ dočasného parkovania na území mesta Prešov pripravuje zavedenie regulácie statickej dopravy aj v Zóne č. 5 a nezregulovanej časti Zóny č. 4 (1 467 parkovacích stojísk). V roku 2026 - parkovacia zóna Sídliisko III, Sekčov.	P
25	Koncepcia budovania nabíjacej infraštruktúry	ORA	15 000,00 €		P_SK - Opatrenie 1.1.1	Počet spracovaných dokumentov		Súčasťou PZ IUI "Tvorba mestskej inovačnej stratégie pre zvýšenie inovačnej konkurencieschopnosti UMR Prešov s cieľom zelenej, digitálnej a udržateľnej transformácie územia" je aj Koncepcia elektromobility - PHZ bola určená vo výške 41 166,67 EUR bez DPH, podaná ŽoNFP.	P
26	Budovanie infraštruktúry pre elektromobily	ORA	243 720,00 €	11 376,00 €	Plán obnovy a odolnosti Rozpočet mesta	Počet nabíjajúcich staníc		Spracovaná štúdia, podaná a schválená žiadosť o PPM, zmluva o PPM - 176 733,78 €, prebieha spracovanie PD na základe ZoD. V rámci projektu bude zrealizovaných 23 nabíjajúcich staníc, 43 nabíjajúcich bodov.	P
						Počet nabíjajúcich bodov			




PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu, udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky
Špecifický cieľ: 1.1.1 Vybudovať udržateľný model multimodálnej a ekologickej mobility

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
27	Modernizácia a budovanie infraštruktúry pre peších	ORA	250 000,00 €	700 008,54 €	Rozpočet mesta	Dĺžka vybudovanej infraštruktúry pre peších (km)	3,92	Zrealizované stavby: <ul style="list-style-type: none"> • Rekonštrukcia chodníkov ul. Masarykova • Oprava ciest a chodníkov ul. Čapajevova, Björnsonova • Lávka pre peších SAD - ŽSR • Úprava chodníkov na ul. Požiarnická Realizované / Pripravené stavby: <ul style="list-style-type: none"> • Chodník Solivarská - ul. Pri Mlyne (prebieha aktualizácia PD) • Chodník na ul. Jánošíkova - pred objektom MY MAMY (príprava PD) • Chodník ul. Fintická (príprava realizačnej PD) 	P
28	Cyklistická infraštruktúra	ORA	2 000 000,00 €	1 274 235,46 €	IROP Plán obnovy a odolnosti P_SK - Opatrenie 2.8.2 Rozpočet mesta	Dĺžka cyklistických komunikácií (km)	5,10	Zrealizované stavby: <ul style="list-style-type: none"> • Cyklochodník pri Prešovskej univerzite s napojením na cyklotrávku, refundovaný 05/2025 z POO • Akčný plán pre zlepšenie podmienok cykl. infraštruktúry pomocou org. opatrení • Bezpečné prechody pre cyklistov v meste Prešov • Cyklochodník na ul. Wolkerovej - I. etapa Realizované / Pripravené stavby : <ul style="list-style-type: none"> • Cyklochodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom - uzatvorená zmluva o PPM • Cyklochodník - prepojenie ul. Royova a Zlatobanská - uzatvorená zmluva o PPM • Cyklochodník Štúrova - Radlinského - PD • Cyklocesta Šváby - Delňa - IPZ Záborské - PD • Cyklistická cestička EUROVELO 11 (Most Jána Pavla II.) - súčasť PD Most Jána Pavla II. • EUROVELO 11 – PREŠOV, POD WILEC HÓRKOU - HANISKA - overovacia štúdia • Cyklochodník na ul. Wolkerovej - II. etapa - príprava PD • Cyklochodník Cemjata - príprava PD 	P
SPOLU (projekty 8 - 28)			110 285 288,17 €	12 595 745,77 €					





PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE

STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu, udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky

Špecifický cieľ: 1.1.2 Nastaviť systém energeticky efektívneho rozvoja

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Nízkouhlíková stratégia	RIA mesta Prešov, n.o.	100 000,00 €		P_SK - Opatrenie 1.1.1 Rozpočet mesta	Počet vypracovaných lokálnych stratégií vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja v oblasti tepelnej energetiky		Nízkouhlíková stratégia tvorí súčasť PZ IÚI "Tvorba mestskej inovačnej stratégie pre zvýšenie inovačnej konkurencieschopnosti UMR Prešov s cieľom zelenej, digitálnej a udržateľnej transformácie územia" - podaná žiadosť o NFP, uzatvorená ZoD.	P
2	Zavedenie systému energetického manažmentu mesta Prešov	RIA mesta Prešov, n.o.	0,00 €		P_SK - Opatrenie 1.2.2 Rozpočet mesta	Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu energetického manažmentu		Súčasť PZ IÚI "Zavádzanie IoT smart riešení v meste Prešov", podaná ŽoNFP.	P
3	Rekonštrukcia objektu Kino Scala v Prešove	ORA	4 830 171,00 €	177 060,00 €	P_SK - Opatrenie 2.1.2 P_SK - Opatrenie 2.2.2 Rozpočet mesta	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou (počet) Podlahová plocha obnovenej verejnej budovy (m ²)		Vydané SP, predpokladaný rozpočtový náklad 7 670 748,43 €.	P
4	Znižovanie energetickej náročnosti materských škôl	RIA mesta Prešov, n.o. ORA OŠKaCR	1 800 000,00 €	1 139 829,97 €	P_SK - Opatrenie 2.1.2 Plán obnovy a odolnosti Environmentálny fond Modernizačný fond Rozpočet mesta	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou (počet) Podlahová plocha obnovenej verejnej budovy (m ²)	3 8 372,85	Zrealizované stavby: • Zlepšenie en. hosp. MŠ Budovateľská 8 • Rýchle en. opatrenia - MŠ Jurkovičova Prešov • Rýchle en. opatrenia - MŠ Zemplínska Prešov Realizované / Pripravované stavby: • Zníženie en. nár. objektu MŠ A. Prídavka - PD dodaná, SP • Zníženie en. nár. objektu MŠ Mukačevská - PD dodaná, SP • Zníženie en. nár. objektu MŠ Jurkovičova - PD, predpokladané celkové výdavky na projekt – 1 861 786,29€, PZ IÚI schválený KR UMR Prešov 06.02.2025, podaná ŽoNFP • Znižovanie en. nár. objektu MŠ Zemplínska 2, Prešov - PD, predpokladané celkové výdavky na projekt - 1 029 008,80 €, PZ IÚI schválený KR UMR Prešov 06.02.2025, podaná ŽoNFP • Zníženie en. nár. objektu materskej školy prof. Márie Podhájeckej - PD, predpokladané celkové výdavky na projekt -1 205 678,75 €, PZ IÚI schválený KR UMR Prešov 06.02.2025, podaná ŽoNFP • vyššie uvedené MŠ - predpokladaný termín predloženia ŽoNFP 06/2025 a realizácia VO do 11/2025 • Rýchle energet. opatrenia - Zvyšovanie energ. efektívnosti mesta Prešov (Hlavná 69, Hlavná 72, MŠ Čsl. armády) - predložená žiadosť o dotáciu, projekt v zásobníku, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nie je predpoklad, že bude poskytnutá dotácia	P



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu, udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky									
Špecifický cieľ: 1.1.2 Nastaviť systém energeticky efektívneho rozvoja									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
5	Znižovanie energetickej náročnosti základných škôl	RIA mesta Prešov, n.o. ORA OŠKaCR	1 300 000,00 €	568 040,52 €	P_SK - Opatrenie 2.1.2 Plán obnovy a odolnosti Rozpočet mesta	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou (počet)	1	Zrealizované stavby: • Rýchle energetické opatrenia - ZŠ Bajkalská Prešov Realizované / Pripravené stavby: • Zníženie en. nár. objektu ZŠ Šmeralova - PD dodaná, ohlásenie drobnej stavby • Podpora energetickej efektívnosti - Základná škola Československej armády - PD dodaná, predpokladané celkové výdavky na projekt – 2 719 694,77 €, PZ IÚI schválený KR UMR Prešov 06.02.2025, ŽoNFP podaná • Rýchle energetické opatrenia - ZŠ Važecká Prešov - PD dodaná, podaná žiadosť o dotáciu, vzhľadom na nedostatočnú alokáciu dotácia nebola poskytnutá	P
						Podlahová plocha obnovenej verejnej budovy (m ²)	5 727,89		
6	Znižovanie energetickej náročnosti ZUŠ	RIA mesta Prešov, n.o. ORA OŠKaCR	800 000,00 €	110 454,00 €	P_SK - Opatrenie 2.1.2 P_SK - Opatrenie 2.2.2 Rozpočet mesta Environmentálny fond Modernizačný fond	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou (počet)		Realizované / Pripravené stavby: • Podpora en. efekt. - ZUŠ Októbrová 32, Prešov - PD pre SP, žiadosť podaná na Modernizačný fond - Envirofond • Podpora en. efekt. - ZUŠ Mikuláša Moyzesa - Volgogradská č. 48 - PD pre SP, predpokladané celkové výdavky na projekt – 670 720,80 €, predpoklad schválenia PZ IÚI v KR UMR Prešov - 09/2025	P
						Podlahová plocha obnovenej verejnej budovy (m ²)			





PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE

STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu, udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky

Špecifický cieľ: 1.1.2 Nastaviť systém energeticky efektívneho rozvoja

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
7	Využívanie OZE v systémoch zásobovania energiou	RIA mesta Prešov, n.o. ORA OŠKaCR	777 992,61 €		P_SK - Opatrenie 2.2.2 Environmentálny fond Rozpočet mesta	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou (počet)		<p>Realizované / Pripravované stavby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zníženie en. nár. objektu MŠ Jurkovičova – predpoklad. celk. výdavky na projekt - 49 965,61 €, PZ IÚI schválený, ŽoNFP podaná • Znížovanie en. nár. objektu MŠ Zemplínska 2, Prešov – predpoklad. celk. výdavky na projekt - 50 653,71 €, PZ IÚI schválený, ŽoNFP podaná • Zníženie en. nár. objektu MŠ prof. Márie Podhájeckej – predpoklad. celk. výdavky na projekt - 28 707,54 €, PZ IÚI schválený, ŽoNFP podaná • Podpora en. efekt. – ZŠ Čsl. armády – predpoklad. celkové výdavky na projekt - 91 116,67 €, PZ IÚI schválený, ŽoNFP podaná • Inštal. zariadení na podporu výroby tepla, teplej vody a el. energie prostredníctvom obnov. nízkoeem. zdrojov pre objekt: • MŠ Bajkalská 31 (prof. profesorky Márie Podhájeckej), Prešov - ZoD - 199 571,79 €, projekt v realizácii • ZŠ Máj. Námestie 1, Prešov - opätovne predložená žiadosť na EF • ZŠ M. Nešpora 2, Prešov - dotácia z EF, VO v procese kontroly, ZoD - 198 498,42 € • MŠ Važecká, 18, Prešov - predpokladané celkové výdavky na projekt - 358 502,59 €, žiadosť o dotáciu z EF na posudzovaní • Podpora en. efekt. - ZUŠ Mikuláša Moyzesa - Volgogradská č. 48 - predpokladané celkové výdavky na projekt - 12 061,47 €, predpoklad schválenia PZ IÚI v KR UMR Prešov - 09/2025 • Podpora en. efekt. – ZUŠ Októbrová 32 	P
8	Optimalizácia energetickej efektívnosti verejného osvetlenia mesta Prešov	RIA mesta Prešov, n.o.	2 500 000,00 €	12 275,40 €	Rozpočet mesta Environmentálny fond	Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe		<p>MsZ schválilo prijatie úveru z Environmentálneho fondu na financovanie investície "Modernizácia / rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia (opatrenia zvyšujúce energetickú účinnosť) v meste Prešov" vo výške 750 000,00 €, svetelno - technická štúdia modernizácie verejného osvetlenia mesta Prešov - modernizácia 1 004 svietidiel a rozvádzačov.</p>	P
SPOLU (projekty 1 - 8)			12 108 163,61	2 007 659,89					



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia									
Špecifický cieľ: 1.2.1 Nastaviť koncepčný prístup k ochrane prírody a krajiny, prevencii rizík a adaptácii na nepriaznivé zmeny klímy									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	General lesoparku	OŽP	80 000,00 €		Rozpočet mesta	Počet spracovaných dokumentov		Aktuálne platný Plán starostlivosti o les 2024 - 2033, MsZ mesta Prešov 25.05.2025 schválilo Štatút prímestských rekreačných lesov mesta Prešov – Lesopark mesta Prešov.	P
2	Spracovanie adaptačnej stratégie/akčného plánu na zmenu klímy	OŽP	15 000,00 €		Environmentálny fond Rozpočet mesta	Počet spracovaných dokumentov		Platí nadradený dokument PSK - Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK. Mesto má spracovaný dokument Zásady adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.	P
3	Koncept zelených okruhov mestom Prešov - projektová dokumentácia	OHA ORA OD OŽP KPM	170 000,00 €	51 660,00 €	Rozpočet mesta P_SK - Opatrenie 1.1.1	Počet spracovaných dokumentov		Súčasť PZ IÚI "Tvorba mestskej inovačnej stratégie pre zvýšenie inovačnej konkurencieschopnosti UMR Prešov s cieľom zelenej, digitálnej a udržateľnej transformácie územia" - uzatvorená ZoD, vypracovaná Analýza Zeleného okruhu (Centrálnej a Sídľiskový Prsteneček, urbanisticko - architektonická, krajínarska a dopravná štúdia "Koncept Zeleného okruhu mesta Prešov", podaná ŽoNFP.	P
4	Park na Masarykovej ulici	OHA	100 000,00 €	4 250,00 €	P_SK - Opatrenie 2.7.4 Rozpočet mesta	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy		Realizovaný participatívny proces s cieľom zhodnotenia aktuálneho stavu a získania spätnej väzby od širokej verejnosti, príprava podkladov na súťaž návrhov, predpokladané celkové výdavky na projekt – 1 933 918,00 €, predpoklad schválenia PZ IÚI "Park na Masarykovej ulici" KR UMR Prešov - 09/2025.	P
5	Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov	ORA	4 512 799,48 €	3 600,00 €	P_SK - Opatrenie 2.7.4 Rozpočet mesta	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach		PZ IÚI schválený KR UMR Prešov 27.06.2024, uzatvorená Zmluva o NFP – 4 585 870,93 €, realizácia projektu začne po splnení odkladacej podmienky účinnosti ZoD (kontrolných procesoch VO Riadiacim orgánom).	P
6	Lesík Delostrelcov	ORA	300 000,00 €		EÚ zdroje - IROP, REACT P_SK - Opatrenie 2.7.4 Rozpočet mesta	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach		Spracovaná PD, vydané SP, ŽoNFP schválená. Vzhľadom na časovú a finančnú náročnosť mesto od projektu odstúpilo. Projekt nerealizovaný aj vzhľadom na výstavbu nemocnice a potenciálne potreby v oblasti dopravnej infraštruktúry.	P
7	Využívanie zrážkovej vody z povrchového odtoku v budovách	ORA	400 000,00 €		Rozpočet mesta	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach		Odbor hlavného architekta vo svojich stanoviskách stavebníkom odporúča využívanie vody z povrchového odtoku v budovách.	N



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia									
Špecifický cieľ: 1.2.1 Nastaviť koncepčný prístup k ochrane prírody a krajiny, prevencii rizík a adaptácii na nepriaznivé zmeny klímy									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
8	Revitalizácia vnútroblokov sídlisk	ORA OŽP	600 000,00 €	187 908,00 €	Rozpočet mesta	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry	815	Náhradná výsadba: • 2023 - 400 ks • 2024 - 415 ks • 2025 - realizácia je plánovaná koncom roka Do výsadby nie je zahrnutá výsadba stromov pri revitalizácii vnútroblokov, realizácii parkovísk a projektov z externých zdrojov. Pozn.: v roku 2025 je plánovaná realizácia projektu "Revitalizácia stromoradií a kvitnúcich záhonov v meste Prešov" o. i. výsadba 72 stromov.	P
9	Výstavba suchých poldrov	OŽP TSmP, a.s.	2 500 000,00 €		Rozpočet mesta	Vybudovaná infraštruktúra		TSmP, a.s. pripravilo projekt zameraný na výstavbu suchých poldrov, ktorý zatiaľ nebol realizovaný a finančne krytý zo strany mesta Prešov. Vodozadržné opatrenie v lesoch - hrádzky, pri výstavbe tunela Okruhliak v mestských lesoch zrealizovaný suchý polder zhotoviteľom stavby.	P
10	Adaptácia mestských lesov na zmenu klímy	OŽP TSmP, a.s.	250 000,00 €		Rozpočet mesta	Vybudovaná infraštruktúra		Nový program starostlivosti o les špecifikuje isté porastové dielce prispôbené na zadržiavanie vody pre lesy.	P
11	Sanácia zosuvných území	ORA OHA	5 000 000,00 €		Environmentálny fond EÚ zdroje Rozpočet mesta	Rozloha sanovaného územia		Spoločný postup obce Lúbotice a mesta Prešov (spoločné VO na dodanie PD na sanáciu zosuvného územia), zapísané v registri zosuvných území.	P
12	Systém monitorovania kvality ovzdušia	OŽP RIA mesta Prešov, n.o.	80 000,00 €		P_SK - Opatrenie 1.2.2. Rozpočet mesta LIFE / MŽP SR	Počet zavedených riešení	3	Projekt Populair (2025 - 2027) - mesto Prešov v spolupráci so SHMÚ a SAŽP - senzory na meranie kvality ovzdušia - prašného spádu, 3 lokality na území mesta (zdroj - LIFE + spolufinancovanie MŽP SR). Kvalita ovzdušia vonkajšieho/vnútorého prostredia bude monitorovaná aj v rámci projektu "Modernizácia SSZ pre potreby preferencie na križovatkách s centrálnym dispečingom (3 merače)."	P
SPOLU (projekty 1 - 12)			14 007 799,48 €	247 418,00 €					



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia									
Špecifický cieľ: 1.2.2 Skvalitniť a zefektívniť systém nakladania s odpadom									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Koncepcia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Prešov	OŽP	30 000,00 €		Rozpočet mesta	Počet spracovaných dokumentov	1	Biela kniha, zavádzanie množstevného odpadu - MsZ 23.09.2023, pilotný režim v IBV.	P
2	Transformačné centrum odpadov	Mesto Prešov TSmP, a.s.	4 000 000,00 €		P_SK - Opatrenie 2.6.2, 2.6.3 Rozpočet mesta TSmP, a. s.	Vybudovaná infraštruktúra		Projekt nerealizovaný. Mesto Prešov malo ambíciu realizovať bioplynnú stanicu/kompostáreň, avšak podmienky program. obdobia 2021 - 2027 neumožnili uskutočnenie projektu v požadovanom rozsahu. V rámci vyhlásenej výzvy bol schválený KR UMR Prešov 22.05.2025 PZ IUI "Podpora intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov v Prešove" - predpokladané celkové výdavky na projekt – 584 366,81 €.	P
3	Zvýšenie kapacity triedeného zberu, zavedením zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území mesta Prešov	Mesto Prešov TSmP, a.s.	572 086,84 €	409 476,00 €	P_SK - Opatrenie 2.6.2 Rozpočet mesta Environmentálny fond TSmP, a.s.	Vyzbieraný triedený odpad Vytriedený komunálny odpad odovzdaný na prípravu na opätovné použitie a recykláciu		Zber kuchynského odpadu sa realizuje na území mesta od 01.01.2023. Spoločnosť TSmP, a.s. z vlastných prostriedkov zakúpila vozidlo na umývanie nádob na BRO - 240 l, 23 l a 10 l vedierka na zber kuchynského odpadu zakúpilo mesto Prešov z prostriedkov Environmentálneho fondu.	P
4	Centrum opätovného použitia	Mesto Prešov PSK MVO	150 000,00 €		EÚ zdroje - DoV MŽP SR Rozpočet mesta	Vybudovaná infraštruktúra		Po zrealizovaní projektu "Podpora intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov v Prešove" je ambíciou zriadenie Reuse centra, n.o.	P
5	Uzamykateľné stojiská kontajnerov	OŽP ORA TSmP, a.s.	180 000,00 €	247 040,62 €	Environmentálny fond Rozpočet mesta	Vybudovaná infraštruktúra	39	Zrealizované aktivity: <ul style="list-style-type: none"> • 2023: 4 ks klieťok - Ul. Mukačevská • 2024: Výstavba a rekonštrukcia 15 ks stojísk na kontajnery - vnútroblok ul. Matice Slovenskej, SDH, ul. Švábska, pod kotolňou, ul. Obr. mieru č. 29 - 31, ul. Obr. mieru č. 33 - 35, ul. Československej armády č. 17 - 23, ul. Antona Prídavka č. 14, ul. Federátov č. 6, 9, ul. 17. novembra, ul. Vihorlatská č. 8, 9, ul. Švábska č. 72 - 78, ZŠ Prostějovská, ul. Vansovej č. 3 a Prostějovská č. 1, rekonštrukcia stojiska ul. Dargovská 6 • 2025: Modernizácia jestvujúcich stojísk kontajnerov: 20 ks + uzamykanie stojísk s antivandalskou ochranou Realizované / Pripravované aktivity: <ul style="list-style-type: none"> • ZoD - 20 ks klieťok – 84 000€ (termín dodania klieťok - 03/2026) • PD na 20 ks klieťok na kontajnerové stojiská - predpoklad - 09/2025 • Modernizácia jestvujúcich 32 stojísk kontajnerov 	P



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE

STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia

Špecifický cieľ: 1.2.2 Skvalitniť a zefektívniť systém nakladania s odpadom

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
6	SMART riešenia v oblasti nakladania s odpadom	Mesto Prešov TSmP, a.s.	80 000,00 €		EFRR - Interreg DRP 2021 - 2027 TSmP, a.s.	Počet zavedených riešení		Spoločnosť TSmP, a.s. je zapojená do medzinárodného projektu GREEN -TEX, ktorého predmetom má byť zakúpenie 27 špeciálnych nádob na textilný odpad so snímačmi naplnenosti. Spolu financovanie: 25 156,62 €, trvanie projektu 01/2024 - 06/2026.	P
7	Bezemisná zberová komunálna technika	Mesto Prešov TSmP, a.s.	1 500 000,00 €		P_SK - DoV TSmP, a.s.	Zmodernizovaná infraštruktúra		Predmetom schváleného eurofondového projektu spoločnosti TSmP, a.s. "Modernizácia vybavenia zberného dvora v meste Prešov" sú aj obstarania bezemisných vozidiel - pohon CNG a elektrické autá. Schválená výška NFP – 841 278,92 €, termín realizácie projektu 01/2025 - 12/2025	P
SPOLU (projekty 1 - 7)			6 512 086,84 €	656 516,62 €					

PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.1 Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre potreby trhu práce

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zlepšiť kvalitu a podmienky pre predprimárne a primárne vzdelávanie

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Koncepcia školstva	OŠKaCR	20 000,00 €	4 950,00 €	Rozpočet mesta	Počet spracovaných dokumentov		Aktuálne prebieha spracovanie Koncepcie školstva.	P
2	Dobudovanie školskej infraštruktúry v oblasti predprimárneho vzdelávania	ORA	2 540 000,00 €		Plán obnovy a odolnosti Rozpočet mesta	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl		MŠ Hviezdoslavova - prebieha realizácia, schválená žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ZoD - 1 834 702,57 €, rozšírenie kapacity - 4 triedy / 96 detí.	P
3	Budovanie, modernizácia a rozvoj infraštruktúry v oblasti primárneho a celoživotného vzdelávania	ORA	1 241 593,75 €	23 282,00 €	P_SK – Špecifický cieľ RSO4.2 Rozpočet mesta	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok		Realizované / Pripravené stavby: <ul style="list-style-type: none"> Škola v spojení s prírodou - ZŠ Šmeralova - 05.03.2025 schválená ŽoNFP - 215 734,65 €, uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP Škola v spojení s prírodou - ZŠ Mirka Nešpora - 30.04.2025 schválená ŽoNFP - 377 613,45 €, v príprave zmluva o NFP Škola v spojení s prírodou - ZŠ Šrobárova - 30.04.2025 schválená ŽoNFP - 278 467,55 €, v príprave zmluva o NFP Škola v spojení s prírodou ZŠ Sibírka - 07.03.2025 schválená ŽoNFP - 277 050,22 €, uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP Škola v spojení s prírodou - ZŠ/MS Námestie Kráľovnej pokoja - 26.03.2025 schválená ŽoNFP - 364 164,84 €, uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP Predpoklad ukončenia VO - 09/2025, kapacita pre 350 žiakov, 954 používateľov.	P



PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.1 Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre potreby trhu práce

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zlepšiť kvalitu a podmienky pre predprimárne a primárne vzdelávanie

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
4	Odstraňovanie bariér v školských budovách na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému	OŠKaCR ORA	500 000,00 €		P_SK – Špecifický cieľ RSO4.2	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdel. zariadení za rok		Súčasťou vyššie uvedených projektov je aj odstraňovanie bariér v školských budovách.	P
5	Vzdelávanie pre 21. storočie	ZŠ na území mesta Prešov	1 500 000,00 €		Plán obnovy a odolnosti - Komponent 7	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok		Digitalizácia základných škôl vo väzbe na obstaranie výpočtovej techniky prebehla na ZŠ Bajkalská, ZŠ Československej armády, ZŠ Kúpeľná, ZŠ Májové Námestie, ZŠ Lesnícka.	P
6	Zabezpečiť odbornú - metodickú pomoc pri vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov pre oblasť sociálne znevýhodnených detí a žiakov	ZŠ na území mesta Prešov	300 000,00 €	3 363 814,00 €	EÚ zdroje MŠVVaŠ SR NIVAM	Počet pracovníkov vo výchovno - vzdelávacom procese zapojených do projektu	86	Školám boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdové náklady pre pedagogických asistentov a školský podporný tím. Prostredníctvom NIVAMu im boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 073 672,00 € a prostredníctvom podporných opatrení (MŠVVaM SR) boli školám poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 290 142,00 €. Počet pedagogických asistentov a členov školského podporného tímu je prehodnocovaný každý školský rok na základe počtu žiakov a zverejnenej metodiky: <ul style="list-style-type: none"> • šk. rok 2022/2023: pedagogický asistent - 65, škol. podporný tím - 11 • šk. rok 2023/2024: pedagogický asistent - 71, škol. podporný tím - 15 • šk. rok 2024/2025: pedagogický asistent - 71, škol. podporný tím - 15 	P
7	Asistent učiteľa a odborná pomoc psychológa, špeciálneho pedagóga a logopéda v podmienkach MŠ	MŠ na území mesta Prešov	288 000,00 €	580 534,00	EÚ zdroje MŠVVaŠ SR	Počet pracovníkov vo výchovno - vzdelávacom procese zapojených do projektu	28	Školám boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdové náklady pre pedagogických asistentov a školský podporný tím (NIVAM – 62 057,00 eur, MŠVVaM SR- 518 477,00 eur) Počet pedagogických asistentov a členov školského podporného tímu je prehodnocovaný každý školský rok na základe počtu žiakov a zverejnenej metodiky: <ul style="list-style-type: none"> • šk. rok 2022/2023: pedagogický asistent - 5, škol. podporný tím - 0 • šk. rok 2023/2024: pedagogický asistent - 18, škol. podporný tím - 9 • šk. rok 2024/2025: pedagogický asistent - 19, škol. podporný tím - 5 	P
SPOLU (projekty 1 - 7)			6 389 593,75 €	3 972 580,00 €					





PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.1 Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre potreby trhu práce

Špecifický cieľ: 2.1.2 Uľahčiť prístup na trh práce všetkým skupinám obyvateľov

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Zriadenie a činnosť sociálneho podniku	MPS, s.r.o	350 000,00 €	55 419,38 €	EÚ Zdroje - ESF Rozpočet mesta	Počet vytvorených a udržaných pracovných miest	32	Víziou MPS, s.r.o. je zvyšovanie lokálnej zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a efektívne zabezpečovanie potrebných verejnoprospešných služieb na území mesta. Pripravuje sa Centrum zdieľaných služieb. Mestský podnik služieb zamestnáva 32 na TPP, 11 osôb v rámci dohody.	P
2	MOPS - Miestna občianska a preventívna služba v Prešove	OSS	333 489,31 €	127 959,71 €	EÚ Zdroje - ESF+	Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby	8	Projekt Miestna občianska a preventívna služba v Prešove je realizovaný v období 03/2024 - 08/2026	P
3	Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov	OSS	500 000,00 €	1 241 917,37 €	EÚ Zdroje - ESF - REACT - EU ESF+ P_SK	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby	73	<ul style="list-style-type: none"> Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby - 4 projekty, refundácia mzdových nákladov opatrovateľiek (01/2022- 12/2023) - 50 zamestnancov Príspevok za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby (01 - 11/2024, 12/2024 - 1/2025) - 73 zamestnancov, projekt trvá do 31.12.2025, najviac vo výške 729 972,36 €, pričom alokované prostriedky boli vyčerpané. 	P
SPOLU (projekty 1 - 3)			1 183 489,31 €	1 425 296,46 €					

PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu kvalitu života

Špecifický cieľ: 2.2.1 Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Bližšie ku komunite	OSS ORA Prešov Real	254 900,00 €	112 000,00 €	Úrad vlády SR Rozpočet mesta	Počet nových komunitných centier	1	Zrekonštruované priestory v komunitnom centre na Starej tehelní. Projekt ukončený.	S
2	Terénna sociálna práca a komunitné centrá („NP Spolu pre komunity“)	OSS	250 000,00 €	292 350,13 €	EÚ Zdroje - ESF P_SK	Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania	8	<ul style="list-style-type: none"> Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivity terénna sociálna práca (8/2023 – 1/2029) - služby využíva 273 klientov. Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivity komunitné centrá (8/2023 – 1/2029) - služby využíva 300 klientov. 	P
						Počet osôb, ktoré využili služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začleňovania	573		
3	Sociálno - zdravotné nízkokapacitné zariadenie, Prešov - Sekčov	ZpS Veselá, Prešov ORA	3 640 000,00 €	20 000,00 €	Plán obnovy a odolnosti - Komponent 13 Rozpočet mesta	Počet nových miest v sociálno - zdravotnom nízkokapacitnom zariadení		Spracovaná PD pre ÚR, PZ IÚI predložený Rade partnerstva PSK - neschválený. Predpokladaná kapacita - 30 osôb.	P



PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu kvalitu života

Špecifický cieľ: 2.2.1 Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
4	Dve novostavby zariadenia pre seniorov Cemjata	ZpS Cemjata ORA OSS	870 100,00 €	46 067,00 €	P_SK – Špecifický cieľ RSO4.3 + RSO4.5 Rozpočet mesta	Počet nových miest v sociálno - zdravotnom nízkokapacitnom zariadení		Spracovaná PD, predpokladané celkové výdavky na projekt - 1 748 177,28 €, predpokladaná kapacita - 12 osôb, predpoklad schválenia PZ IÚI KR UMR Prešov - 09/2025.	P
5	Rekonštrukcia ZpS Harmónia Cemjata	ORA	1 610 610,00 €	1 671 398,70 €	ŠFRB Rozpočet mesta	Kapacita pobytových služieb komunitného charakteru a zdravotno - sociálnych nízkokapacit. zariadení	40	Stavba ukončená, celkový náklad stavby 1 774 523,26 €.	S
6	Rekonštrukcia ČOV v ZpS Harmónia - ZpS Cemjata	ORA	390 000,00 €		P_SK – Opatrenie 2.5.7 Rozpočet mesta	Vybudovaná infraštruktúra		PZ IÚI schválený KR UMR Prešov 05.09.2024, schválená ŽoNFP - 432 374,45 €.	P
7	Podpora opatrovateľskej služby	OSS			EÚ Zdroje - ESF+ P_SK	Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia	142	Finančná náročnosť je uvedená v projekte "Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov".	P
SPOLU (projekty 1 - 7)			7 015 610,00 €	2 141 815,83 €					

PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu kvalitu života

Špecifický cieľ: 2.2.2 Vytvoriť podmienky pre zdravý životný štýl

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Koncepcia športu	OŠKaCR	15 000,00 €		Rozpočet mesta	Počet spracovaných dokumentov		Prebieha príprava dokumentu	P
2	Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov	ORA	372 000,00 €	372 213,35 €	Fond na podporu športu Rozpočet mesta	Podporená infraštruktúra	1	Stavba ukončená.	S
3	Futbal Tatran aréna Prešov	FTA, s.r.o.	25 000 000,00 €	24 426 349,03 €	Fond na podporu športu Slovenský futbalový zväz Rozpočet mesta Rozpočet PSK / Výzva pre región	Podporená infraštruktúra	1	Stavba ukončená, cena diela bez DPH.	S
4	Vybudovanie mládežníckej akadémie FC Tatran Prešov	ORA	130 440,11 €	130 380,10 €	Rozpočet mesta Rozpočet PSK / Výzva pre región	Podporená infraštruktúra	1	Dobudovanie športovej infraštruktúry na Jazdeckej ul. 1, stavba ukončená.	S





PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu kvalitu života

Špecifický cieľ: 2.2.2 Vytvoriť podmienky pre zdravý životný štýl

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
5	Zimný štadión	ORA	1 750 000,00 €	1 118 373,00 €	Fond na podporu športu Rozpočet mesta	Podporená infraštruktúra	1	Zrealizované stavby: • Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov - stavebné práce ukončené. Realizované / Pripravované stavby: • Využitie odpadového tepla a realizácia ďalších opatrení za účelom zníženia prevádzkových nákladov a odstránenie systémových porúch na objekte Zimného štadióna - PD dodaná • Stavebné úpravy miestností - ICE ARÉNA Zimný štadión - predpoklad ukončenia 8/2025 • Príprava, vypracovanie PD na bleskozvod Zimného štadióna a zároveň prípravné práce na dodávku a montáž (realizáciu) bleskozvodu.	P
6	Multimediálna kocka	ORA	200 122,37 €	282 213,00 €	Rozpočet mesta Rozpočet PSK / Výzva pre región	Podporená infraštruktúra	1	Stavba ukončená.	S
7	Pohybom k spájaniu komunit - multišportová zóna Prešov	ORA	628 240,87 €	10 920,00 €	P_SK - Opatrenie 5.1.4 Rozpočet mesta	Podporená infraštruktúra		ŽoNFP schválená 29.04.2025, podpísaná zmluva o NFP, ukončené VO, predpokladané celkové výdavky na projekt - 628 240,87 €.	P
8	Športový areál	ORA OHA	200 000,00 €	54 600,00 €	PSK - Výzva pre región Rozpočet mesta	Podporená infraštruktúra		Vypracovaná overovacia štúdia, DUR.	P
9	Revitalizácia a modernizácia areálu Delňa	ORA	1 800 000,00 €		Rozpočet mesta	Podporená infraštruktúra		Prebieha spracovanie PD k demontáži stavby tobogánu.	P
SPOLU (projekty 1 - 9)			30 095 803,35 €	26 395 048,48 €					

PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu kvalitu života

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Hasičská zbrojnica DHZM Prešov - energetická úspora budovy	ORA DHZM Prešov	1 035 037,72 €	46 200,00 €	P_SK - DoV	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou (počet) Podlahová plocha obnovennej verejnej budovy (m ²)		Schválená žiadosť o NFP, uzatvorená zmluva o NFP, celková zazmluvnená suma - 1 061 208,08 €	P



PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu kvalitu života

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
2	Obnova, modernizácia a rozvoj Mestského kamerového systému	ORA MsP	150 000,00 €	70 709,86 €	EÚ zdroje - IROP P_SK - Opatrenie 5.1.3 Rozpočet mesta	Podporená infraštruktúra	47	<p>Zrealizované aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023 - 5 ks (Park Mládeže) • 2024 - MsP v roku 2024 realizovala rozšírenie kamerového systému: 4 x IP kamera statická na ulici K starej tehelni za 9 574,32 €, zakúpená 5 x kamera IP statická AI, čítanie ŠPZ – 10 800,00 €, 20 x IP statická dohľadová – 11 760,00 €. V rámci projektu Prešov – Nižná Šebastová, Pánska záhrada bolo osadených 7 ks IP statických kamier • 2025 - osadené kamery: Kamera A. Dubčeka 1 ks, kamera Levočská čítanie ŠPZ 1 ks, kamera Obrancov mieru ŠPZ 1 ks a dohľadová 1 ks, Kamera Weberová dohľadová 1 ks, Sabinovská ŠPZ 1 ks <p>Realizované / Pripravené aktivity:</p> <p>Kamerový systém riešený v rámci projektu "Zavádzanie IoT smart riešení v meste Prešov" (201 628,25 €), ktorý schválila KR UMR Prešov, súhlasné stanovisko MIRRI SR k realizácii IT projektu. Kamery budú osadené v priestore Záhrady umenia, Kmeťovho stromoradia (5 otočných a 12 statických kamier).</p>	P
3	Vybudovanie detského dopravného ihriska	ORA	250 000,00 €		Rozpočet mesta	Podporená infraštruktúra		Zámer obnoviť Dopravné ihrisko v rámci Konceptu zelených okruhov mestom Prešov (obnova dopravného ihriska, vybudovanie učebne pre výuku ekológie, dopravnej výchovy a environmentálneho povedomia).	P
SPOLU (projekty 1 - 3)			1 435 037,72 €	116 909,86 €					

PRIORITA 3 - STRATEGICKÝ ROZVOJ A DOBRÉ SPRÁVOVANIE

STRATEGICKÝ CIEĽ: 3.1 Zlepšiť systém strategického plánovania, riadenia a spolupráce

Špecifický cieľ: 3.1.1 Vybudovať analytické, strategické, projektové a administratívne kapacity

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Administratívne kapacity UMR Prešov	ÚUMR	340 000,00 €	174 576,81 €	P_SK - Technická pomoc Rozpočet mesta	Vytvorené pracovné miesta v podporených subjektoch	3	Mzdové výdavky na 3 zamestnancov AK UMR, materiálno - technické vybavenie.	P
2	Metodicko - analytická jednotka	OISaS RIA mesta Prešov, n. o.	1 500 000,00 €	97 017,32 €	P_SK - Opatrenie 1.1.1 Rozpočet mesta	Vytvorené pracovné miesta v podporených subjektoch	2,5	Mzdové výdavky na zamestnancov OISaS, technické, softvérové vybavenie.	P



PRIORITA 3 - STRATEGICKÝ ROZVOJ A DOBRÉ SPRÁVOVANIE									
STRATEGICKÝ CIEL: 3.1 Zlepšiť systém strategického plánovania, riadenia a spolupráce									
Špecifický cieľ: 3.1.1 Vybudovať analytické, strategické, projektové a administratívne kapacity									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
3	KAPA - kapacity pre partnerstvá a participáciu	ORA	252 000,00 €	13 311,98 €	P_SK - Opatrenie 5.1.1, 5.1.2 Rozpočet mesta	Vytvorené pracovné miesta v podporených subjektoch	1	Mzdové výdavky na koordinátora participácie.	P
4	Rozvojová implementačná agentúra mesta Prešov, n.o.	RIA mesta Prešov, n. o.	540 000,00 €	493 300,00 €	Rozpočet mesta	Vytvorené pracovné miesta v podporených subjektoch	9	Mzdové výdavky na zamestnancov.	P
SPOLU (projekty 1 - 4)			2 632 000,00 €	778 206,11 €					

PRIORITA 3 - STRATEGICKÝ ROZVOJ A DOBRÉ SPRÁVOVANIE									
STRATEGICKÝ CIEL: 3.1 Zlepšiť systém strategického plánovania, riadenia a spolupráce									
Špecifický cieľ: 3.1.2 Podporovať digitálnu transformáciu vo všetkých oblastiach									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Digitálne dvojča mesta Prešov	MIRRI SR ORA	100 000,00 €	98 516,00 €	Plán obnovy a odolnosti	Softvérové riešenie	1	Vyvinutý a testovaný funkčný prototyp softvéru, ktorý meria okamžitú spotrebu energie a vody, posiela údaje do MQTT servera integrovaného v softvérovom riešení, softvér je už kompatibilný s novým štandardom dátového skladu mesta (gitlab). Projekt ukončený.	S
						Verejné inštitúcie podporené pri vývoji inovatívnych služieb, produktov a procesov	1		
2	Digitálny občan	MIRRI SR ORA	100 000,00 €		Plán obnovy a odolnosti	Verejné inštitúcie podporené pri vývoji inovatívnych služieb, produktov a procesov		Projekt v realizácii, termín ukončenia - 09/2025, opakované VO, uzatvorená ZoD.	P
3	Zavádzanie IoT smart riešení v meste Prešov	OISaS RIA mesta Prešov, n. o.	4 000 000,00 €		P_SK - Opatrenie 1.2.2 Rozpočet mesta	Používatelia nových a vylepšených verejných inovatívnych služieb, produktov a procesov		PZ IÚI "Zavádzanie IoT smart riešení v meste Prešov" schválený KR UMR Prešov 05.09.2024, podaná ŽoNFP - 3 858 640,65 €, ukončený proces posudzovania projektu v zmysle vyhlášky 401/2023 (MetaS) - stanovisko o schválení.	P
						Verejné inštitúcie podporené pri vývoji inovatívnych služieb, produktov a procesov			
4	Informačný systém na komplexnú správu analytických dát	OISaS RIA mesta Prešov, n. o.	550 000,00 €		P_SK - Opatrenie 1.1.1 Rozpočet mesta	Používatelia nových a vylepšených verejných inovatívnych služieb		Súčasť PZ IÚI "Tvorba mestskej inovačnej stratégie pre zvýšenie inovačnej konkurencieschopnosti UMR Prešov s cieľom zelenej, digitálnej a udržateľnej transformácie územia." Vybudovanie a nastavenie funkčného systému pre zber a spracovanie informácií - Dátový sklad, Analytickej jednotky, fyzického priestoru pre zriadenie tzv. URBAN INNOVATION LAB.	P
						Verejné inštitúcie podporené pri vývoji inovatívnych služieb, produktov a procesov			
SPOLU (projekty 1 - 4)			4 750 000,00 €	98 516,00 €					



PRIORITA 3 - STRATEGICKÝ ROZVOJ A DOBRÉ SPRÁVOVANIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 3.1 Zlepšiť systém strategického plánovania, riadenia a spolupráce									
Špecifický cieľ: 3.1.3 Podporovať medzisektorové partnerstvá									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	MIS - Mestská inovačná stratégia	OISaS RIA mesta Prešov, n. o.	200 000,00 €		P_SK - Opatrenie 1.1.1 Rozpočet mesta	Verejné inštitúcie podporené pri vývoji inovatívnych služieb, produktov a procesov		Súčasť PZ IÚI "Tvorba mestskej inovačnej stratégie pre zvýšenie inovačnej konkurencieschopnosti UMR Prešov s cieľom zelenej, digitálnej a udržateľnej transformácie územia" schválený KR UMR Prešov 05.09.2024, ZoD 196 800,00 €, pričom zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorou je kontrola VO zo strany ÚVO, resp. poskytovateľa NFP.	P
2	MIP Prešov	OISaS RIA mesta Prešov, n. o.	1 600 000,00 €		P_SK - Opatrenie 1.1.1 Rozpočet mesta	Verejné inštitúcie podporené pri vývoji inovatívnych služieb, produktov a procesov		Plánované MIP vznikne v rámci projektu "Tvorba mestskej inovačnej stratégie pre zvýšenie inovačnej konkurencieschopnosti UMR Prešov s cieľom zelenej, digitálnej a udržateľnej transformácie územia".	P
SPOLU (projekty 1 - 2)			1 800 000,00 €						

PRIORITA 3 - STRATEGICKÝ ROZVOJ A DOBRÉ SPRÁVOVANIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 3.2 Využiť potenciál územia pre ekonomický rozvoj									
Špecifický cieľ: 3.2.1 Rozvíjať inovačný potenciál, podporovať vedu, výskum a všetky typy inovácií									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	MIP Prešov	OISaS RIA mesta Prešov, n. o.			P_SK - Opatrenie 1.1.1 Rozpočet mesta	Verejné inštitúcie podporené pri vývoji inovatívnych služieb, produktov a procesov		Plánované MIP vznikne v rámci projektu "Tvorba mestskej inovačnej stratégie pre zvýšenie inovačnej konkurencieschopnosti UMR Prešov s cieľom zelenej, digitálnej a udržateľnej transformácie územia." Súčasťou projektu bude vznik Mestského inovačného centra na Hlavnej 72 v Prešove.	P
SPOLU									



PRIORITA 3 - STRATEGICKÝ ROZVOJ A DOBRÉ SPRAVOVANIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 3.2 Využiť potenciál územia pre ekonomický rozvoj									
Špecifický cieľ: 3.2.2 Rozvíjať potenciál pre kultúrny a kreatívny priemysel									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Rekonštrukcia nádvorja Čierneho orla	ORA	500 000,00 €	14 146,80 €	P_SK - Opatrenie 5.1.5 Rozpočet mesta	Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor		PZ IÚI schválený KR UMR Prešov 28.11.2024, ŽoNFP rozpracovaná, prebieha proces stav. konania, predpokladané celkové výdavky na projekt - 923 951,92 €.	P
SPOLU			500 000,00 €	14 146,80 €					
PRIORITA 3 - STRATEGICKÝ ROZVOJ A DOBRÉ SPRAVOVANIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 3.2 Využiť potenciál územia pre ekonomický rozvoj									
Špecifický cieľ: 3.2.3 Rozvíjať potenciál územia vďaka komplexnej podpore podnikania									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Mestské opevnenie hradobný múr - 1. etapa	ORA	342 254,46 €	401 335,30 €	P_SK - Opatrenie 5.1.5 Rozpočet mesta	Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor (m ²)	574,37	Stavba ukončená, schválená ŽoNFP – 391 571,29 €.	S
2	Zelený okruh Prešovom	ORA	2 500 000,00 €		Rozpočet mesta	Verejné inštitúcie podporené pri vývoji inovatívnych služieb, produktov a procesov		Prebieha spracovanie dokumentu Konceptu zelených okruhov mestom Prešov.	P
3	Kultúrny pavilón	ORA	600 000,00 €		P_SK - Opatrenie 5.1.5 Rozpočet mesta	Podporená infraštruktúra		Spracovaná PD, vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť stavby mesto zvažuje alternatívne riešenie zázemia.	P
4	Prešovská kalvária - Miesto spájajúce nebo so zemou	OHA ORA RIA mesta Prešov, n.o.	200 000,00 €		MK SR Interreg PL – SK Rozpočet mesta	Podporená infraštruktúra		Podaný projekt v rámci Interreg PL - SK (v spolupráci s mestom Mukačevo) - nepodporený, vypracovaná štúdia.	P
SPOLU (projekty 1 - 4)			3 642 254,46 €	401 335,30 €					
CELKOM (Priority 1 – 3)			202 357 126,69 €	50 851 195,12 €					



Obec Ľubotice

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030
za obdobie rokov 2023 - 2025



OBEC L'UBOTICE

Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 za obdobie rokov 2023 – 2025

Tabuľka 4 Kvantitatívne vyhodnotenie Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec Lúbotice


OBEC L'UBOTICE							
Priorita	Špecifický cieľ	Počet intervencií*				Finančná náročnosť	
		Celkovo	Splnené	Priebežné plnenie	Nesplnené	Indikatívny rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2025
1 – ENVIRO Udržateľné a odolné prostredie	ŠC 1.1.1 - Doprava	8	0	7	1	5 737 898,88 €	0,00 €
	ŠC 1.1.2 - Energetika	3	0	3	0	1 700 000,00 €	76 525,49 €
	ŠC 1.2.1 - Klíma	2	0	2	0	250 000,00 €	0,00 €
	ŠC 1.2.2 - Odpad	2	1	1	0	350 000,00 €	145 196,00 €
	SPOLU	15	1	13	1	8 037 898,88 €	221 721,49 €
2 – ĽUDIA Služby pre dôstojný život	ŠC 2.1.1 - Vzdelávanie	2	0	1	1	500 000,00 €	0,00 €
	ŠC 2.1.2 - Práca	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	ŠC 2.2.1 - Sociálne a zdravotnícke služby	4	1	0	3	2 160 000,00 €	202 691,55 €
	ŠC 2.2.2 - Šport	3	1	1	1	1 056 000,00 €	73 000,00 €
	ŠC 2.2.3 - Bezpečnosť	2	0	1	1	450 000,00 €	0,00 €
SPOLU	11	2	3	6	4 166 000,00 €	275 691,55 €	
CELKOM		26	3	16	7	12 203 898,88 €	497 413,04 €

* **Intervencia** = konkrétna rozvojová aktivita / projekt


Obec Lúbotice sa v rokoch 2023 – 2025 primárne venovala realizácii rozvojových aktivít a projektov zameraných na budovanie udržateľného a odolného prostredia a služby pre občanov obce v rôznych oblastiach. Obec **plánovala realizáciu celkom 26 rozvojových aktivít a projektov**, pričom k 30.06.2025 je **zrealizovaných celkom 11%** intervencií, **v štádiu rozpracovanosti je 62 %** intervencií (prebieha projektová príprava, majetkovo-právne vysporiadanie, verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela a pod.) a **27 % intervencií sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať**, primárne z kapacitných a finančných dôvodov (neboli vyhlásené relevantné výzvy, resp. alokácie pre vyhlásené výzvy boli vyčerpané). Viac informácií, vid' nižšie uvedené grafy č. 4 a 5.



Graf 4 Prehľad plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec Ľubotice



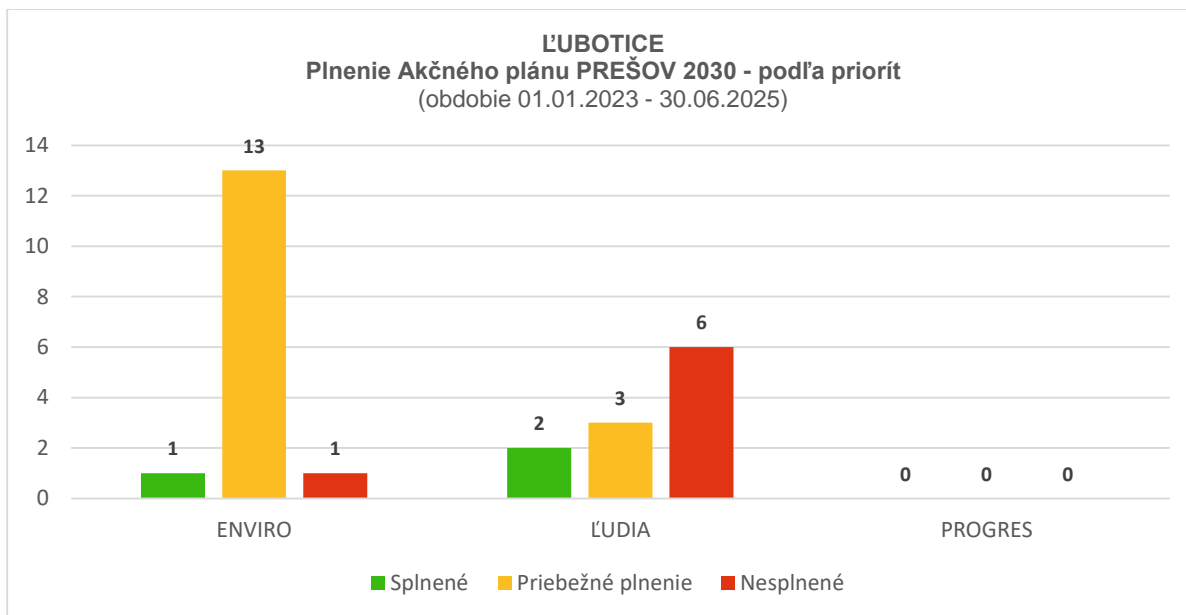


Graf 5 Percentuálne vyjadrenie plnenia plánovaných aktivít Akčného plánu PREŠOV 2030 – obec Ľubotice

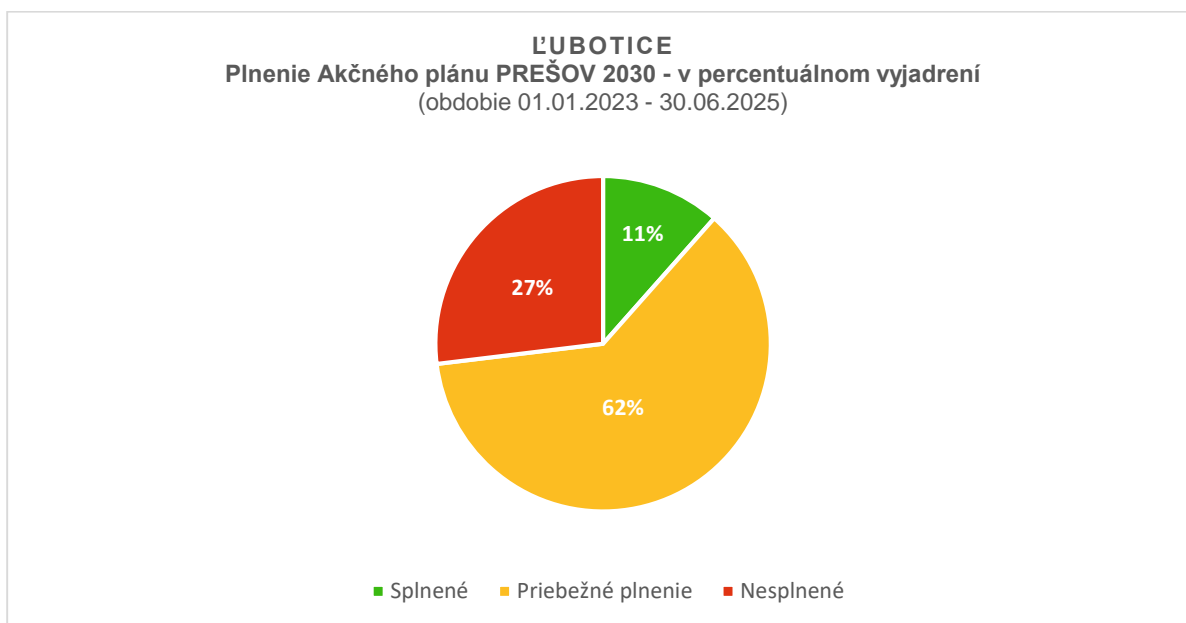

Obec Ľubotice sa v rokoch 2023 - 2025 venovala príprave a realizácii aktivít a projektov zameraných na budovanie udržateľného a odolného prostredia (skvalitnenie systému nakladania s odpadom) a skvalitnenie služieb pre občanov (vzdelávacia infraštruktúra, vytváranie podmienok pre zdravý životný štýl, a i.). **Zrealizované boli projekty v hodnote cca 500 tis. €.**

Je potrebné zdôrazniť, že obec intenzívne pracovala na príprave projektov, kde predpokladá čerpanie EÚ zdrojov v rámci Programu Slovensko - rozšírenie kapacity jedálne pri ZŠ - I. etapa (839 013 €), športová infraštruktúra pri ZŠ (1 080 741 €), 2. etapa cyklochodníka popri MK2 - Ľubotice (cca 500 tis.€). Všetky projekty sú vo vysokom štádiu pripravenosti.





OBEC ĽUBOTICE

Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 - 2025 podľa prioritných oblastí

Tabuľka 5 Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 – 2025 podľa prioritných oblastí – obec Ľubotice

PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu a udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky									
Špecifický cieľ: 1.1.1 Vybudovať udržateľný model multimodálnej a ekologickej mobility									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy	PSK / SUC PSK obec Ľubotice	2 000 000,00 €		Rozpočet PSK Štátny rozpočet EÚ zdroje	Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Vypracovaná technická štúdia, ukončené zisťovacie konanie, prebieha realizácia PD v stupni DUR/stavebný zámer (plánovaná dĺžka vybudovaných komunikácií - 8,68 km).	P
2	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	Obec Ľubotice	637 898,88 €		EÚ zdroje Rozpočet obce	Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Zhotovená realizačná PD. Plánovaná dĺžka rekonštrukcie Ľubochianskej ulice v rozsahu 404,7 m.	P
3	Výstavba komunikácií MK4, MK5	Obec Ľubotice	1 000 000,00 €		Rozpočet obce	Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Prebieha príprava PD pre stavebné povolenie, prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Plánovaná obnova komunikácií MK4 a MK5 je 552,8 m. Súčasťou projektu je aj úprava komunikácie I/20 v dĺžke 113 m.	P
4	Výstavba komunikácie MK8	Obec Ľubotice	1 000 000,00 €		Rozpočet obce	Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Prebieha príprava PD pre stavebné povolenie, prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Plánovaná dĺžka výstavby komunikácie MK8 je 351,1 m.	P
5	Rekonštrukcia Domaškej ulice	Obec Ľubotice	200 000,00 €		Rozpočet obce	Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Prebieha VO na dodávateľa. Začiatok realizácie je plánovaný na júl/august 2025. Rekonštrukcia v celkovej dĺžke 207,45 m.	P
6	Rekonštrukcia Cintorínskej ulice	Obec Ľubotice	150 000,00 €		Rozpočet obce	Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov.	N
7	Rekonštrukcia Strážnickej ulice	Obec Ľubotice	250 000,00 €		Rozpočet obce	Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Projekt je pred začiatkom realizácie. Plánovaná realizácia júl/august 2025 sa posúva, z dôvodu výhrad príslušného Výboru mestskej časti Prešov. Rekonštrukcia v dĺžke 157 m.	P
8	2. etapa cyklochodníka popri MK2	Obec Ľubotice	500 000,00 €		P_SK - Opatrenie 2.8.2 Rozpočet obce	Dĺžka vybudovaných komunikácií (km)		Projekt v príprave. Prebieha výkup pozemkov. Cyklochodník bude mať dĺžku 923 m.	P
SPOLU (1 – 8)			5 737 898,88 €						


PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu a udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky
Špecifický cieľ: 1.1.2 Nastaviť systém energeticky efektívneho rozvoja

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Rekonštrukcia objektu šatní	Obec L'ubotice	700 000,00 €		Environmentálny fond Rozpočet obce	Podporná infraštruktúra		Podaná žiadosť v rámci výzvy na zníženie energetickej náročnosti cez Environmentálny fond vo výške 675 106,86 €.	P
2	Rekonštrukcia polyfunkčného objektu na Korabinského ulici	Obec L'ubotice	500 000,00 €	76 525,49 €	Rozpočet obce	Podporná infraštruktúra	1	Čiastočne zrealizované (209 m ²) - objekt slúži obecnému úradu a verejnosti ako spoločenská sála.	P
3	Optimalizácia energetickej efektívnosti verejného osvetlenia	Obec L'ubotice	500 000,00 €		Rozpočet obce	Podporná infraštruktúra		Projekt je v štádiu prípravy projektového zámeru. Prebiehajú rokovania s dodávateľom.	P
SPOLU (1 – 3)			1 700 000,00 €	76 525,49 €					

PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia
Špecifický cieľ: 1.2.1 Nastaviť koncepčný prístup k ochrane prírody a krajiny, prevencii rizík a adaptácii na nepriaznivé zmeny klímy

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Vítajte v L'uboticiach	Obec L'ubotice	100 000,00 €		Rozpočet obce	Podporná infraštruktúra		Projekt je v štádiu prípravy projektového zámeru.	P
2	Výstavba relaxačno oddychovej zelenej zóny	Obec L'ubotice	150 000,00 €		Rozpočet obce	Podporná infraštruktúra		Projekt je v štádiu prípravy projektového zámeru.	P
SPOLU (1 – 2)			250 000,00 €						

PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia
Špecifický cieľ: 1.2.2 Skvalitniť a zefektívniť systém nakladania s odpadom

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Rozšírenie dočasného zberného miesta na zber odpadov	Obec L'ubotice	150 000 €	59 952,00 €	Rozpočet obce	Rozšírenie dočasného zberného miesta (m ²)	148,5	Projekt zrealizovaný.	S





PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia									
Špecifický cieľ: 1.2.2 Skvalitniť a zefektívniť systém nakladania s odpadom									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
2	Vybudovanie stojísk pre polozápuštné kontajnery	Obec L'ubotice	200 000 €	85 244,00 €	Rozpočet obce	Vybudovanie polozápuštných kontajnerov (ks)	14	Čiastočne zrealizované. Zrealizované prvé dve etapy: 1. etapa: ul. Tekelová - 7 kontajnerov, ul. Hapáková - 4 kontajnery - 67 280 €, 2. etapa: cintorín - 3 kontajnery - 17 964 €.	P
SPOLU (1 - 2)			350 000,00 €	145 196,00 €					

PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.1 Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre potreby trhu práce									
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zlepšiť kvalitu a podmienky pre predprimárne a primárne vzdelávanie									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Dostupnosť - Inklúzia - Kvalita Základnej školy v L'ubotíciach	Obec L'ubotice	500 000,00 €		P_SK Špecifický cieľ RSO 4.2 Rozpočet obce	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry		Podaná žiadosť o NFP cez P_SK - RSO 4.2 vo výške 839 013,75 €. Ukončené VO.	P
2	Rozšírenie kapacity materskej školy	Obec L'ubotice	0,00 €		Plán obnovy a odolnosti Rozpočet obce	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdel. zariadeniach Používatelia nových alebo modernizovaných vzdel. zariadení za rok		Projekt nebol realizovaný z dôvodu uzavretia výzvy z Fondu obnovy. Projekt bude realizovaný po vyhlásení novej výzvy na výstavbu MŠ.	N
SPOLU (1 - 2)			500 000,00 €						


PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT
STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu života
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Obnova cintorína v obci L'ubotice	Obec L'ubotice	60 000,00 €	202 691,55 €	Rozpočet obce PPA	Zmodernizovaná infraštruktúra	1	Projekt zrealizovaný. Vybudované optietenie v dĺžke 77 m. Vybudovaná pešia komunikácia v dĺžke 161 m.	S
2	Rozšírenie cintorína s výstavbou domu smútku	Obec L'ubotice	1 000 000,00 €		Rozpočet obce	Zmodernizovaná infraštruktúra		Projekt nebol zrealizovaný z dôvodu komplikovaného majetko-právneho vysporiadania pozemkov.	N
3	Rekonštrukcia a prístavba Obecného domu	Obec L'ubotice	600 000,00 €		EÚ zdroje Rozpočet obce	Vybudovaná infraštruktúra		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov.	N
4	Rozširovanie sociálnych služieb komunitného typu pre obyvateľov obce	Obec L'ubotice	500 000,00 €		Rozpočet obce	Počet osôb, ktoré využili služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov.	N
SPOLU (1 – 4)			2 160 000,00 €	202 691,55 €					

PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT
STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu života
Špecifický cieľ: 2.2.2 Vytvoriť podmienky pre zdravý životný štýl

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Revitalizácia tenisového a volejbalového ihriska	Obec L'ubotice	73 000,00 €	73 000,00 €	Rozpočet obce	Zmodernizovaná infraštruktúra	2	Projekt zrealizovaný.	S
2	Rekonštrukcia športového areálu ZŠ L'ubotice	Obec L'ubotice	913 000,00 €		P_SK - Opatrenie 5.1.4 Rozpočet obce	Vybudovaná infraštruktúra		Schválená žiadosť o NFP cez P_SK 5.1.4 v hodnote 1 080 741,36 €. Prebieha proces VO.	P
3	Výstavba hokejbalového ihriska	Obec L'ubotice	70 000,00 €		Fond na podporu športu Rozpočet obce	Vybudovaná infraštruktúra		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov.	N
SPOLU (1 – 3)			1 056 000,00 €	73 000,00 €					





PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu života									
Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Bezpečnejšia obec	Obec L'ubotice	50 000,00 €		Rozpočet obce	Počet zavedených riešení		Prebieha realizácia projektu. Vybudované kamery: 4x dočasné zberné miesto odpadu na ulici Pod Hájom 4x komunitné centrum na ulici Makarenkovej 2x na budove OcÚ na ulici Makarenkovej	P
2	Výstavba hasičskej stanice	Obec L'ubotice	400 000,00 €		Rozpočet obce	Vybudovaná infraštruktúra		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov.	N
SPOLU (1 – 2)			450 000,00 €						
Celkom (Priority 1 – 2)			12 203 898,88 €	497 413,04 €					





Obec Haniska

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030
za obdobie rokov 2023 - 2025



OBEC HANISKA

Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 za obdobie rokov 2023 – 2025


Tabuľka 6 Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec Haniska

OBEC HANISKA							
Priorita	Špecifický cieľ	Počet intervencií*				Finančná náročnosť	
		Celkovo	Splnené	Priebežné plnenie	Nesplnené	Indikatívny rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2025
1 – ENVIRO Udržateľné a odolné prostredie	ŠC 1.1.1 - Doprava	4	0	3	1	3 160 000,00 €	0,00 €
	ŠC 1.1.2 - Energetika	1	0	0	1	80 000,00 €	0,00 €
	ŠC 1.2.1 - Klíma	5	0	5	0	2 220 000,00 €	2 788,77 €
	ŠC 1.2.2 - Odpad	1	0	1	0	100 000,00 €	2 184,00 €
	SPOLU	11	0	9	2	5 560 000,00 €	4 972,77 €
2 – ĽUDIA Služby pre dôstojný život	ŠC 2.1.1 - Vzdelávanie	1	0	1	0	300 000,00 €	71 877,00 €
	ŠC 2.1.2 - Práca	2	0	2	0	250 000,00 €	0,00 €
	ŠC 2.2.1 - Sociálne a zdravotnícke služby	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	ŠC 2.2.2 - Šport	1	1	0	0	500 000,00 €	131 899,70 €
	ŠC 2.2.3 - Bezpečnosť	1	1	0	0	60 000,00 €	9 410,75 €
	SPOLU	5	2	3	0	1 110 000,00 €	213 187,45 €
3 – PROGRES Strategický rozvoj a dobré spravovanie	ŠC 3.1.1 - Kapacity	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	ŠC 3.1.2 - Digitalizácia	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	ŠC 3.1.3 - Spolupráca	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	ŠC 3.2.1 - Inovácie	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	ŠC 3.2.2 - Kultúrny a kreatívny priemysel	2	0	1	1	80 000,00 €	0,00 €
	ŠC 3.2.3 - Podnikanie	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	SPOLU	2	0	1	1	80 000,00 €	0,00 €
CELKOM	18	2	13	3	6 750 000,00 €	218 160,22 €	


Intervencia = konkrétna rozvojová aktivita / projekt






Graf 6 Prehľad plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec Haniska

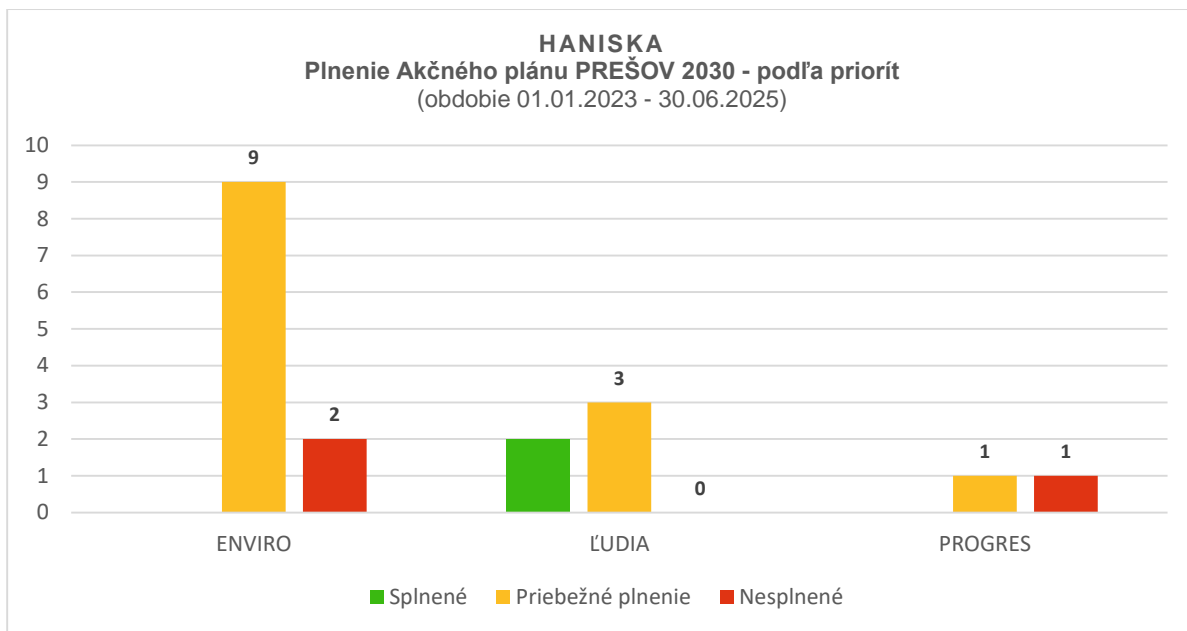

Graf 7 Percentuálne vyjadrenie plnenia plánovaných aktivít Akčného plánu PREŠOV 2030 – obec Haniska

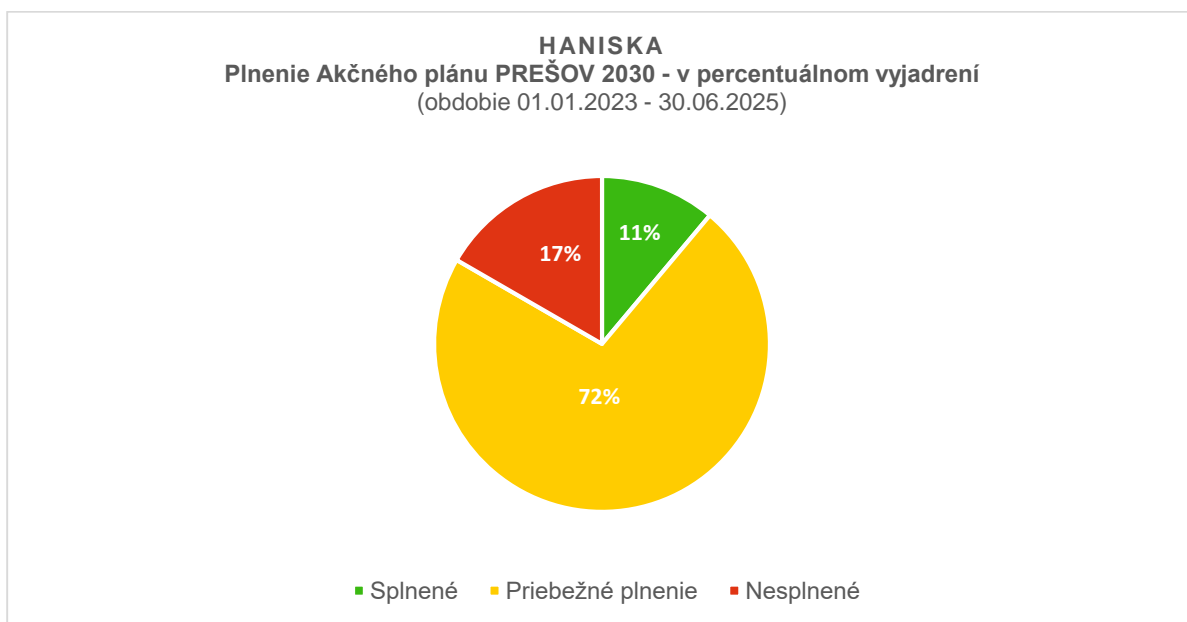

Obec Haniska v rokoch 2023 - 2025 **plánovala realizáciu celkom 18 rozvojových aktivít a projektov.** K 30.06.2025 je **zrealizovaných celkom 11%** intervencií zameraných na zlepšenie služieb pre občanov, **v štádiu rozpracovanosti je 72 %** intervencií a **17 % intervencií sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať**, primárne z kapacitných a finančných dôvodov. V sledovanom období boli primárne realizované projekty zamerané na zvýšenie kvality služieb občanom - vybudované bolo multifunkčné ihrisko, prebiehala rekonštrukcia MŠ či rozšírenie kanalizácie a vodovodu. Zároveň bola zahájená realizácia projektu Príťažlivejšia Haniska.





OBEC HANISKA

Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 - 2025 podľa prioritných oblastí

Tabuľka 7 Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 – 2025 podľa prioritných oblastí – obec Haniska

PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu a udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky									
Špecifický cieľ: 1.1.1 Vybudovať udržateľný model multimodálnej a ekologickej mobility									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov	Obec Haniska	400 000,00 €		EÚ zdroje Rozpočet obce	Celková dĺžka vybudovaných a zrekonštruovaných komunikácií (km)		Prebieha rekonštrukcia kom. a chodníkov na úsekoch: Cesta pod Baňou- 3,64 km (176 800 €), ul. Krompašská (0,13 km, 6 840 €).	P
2	Stojiská na bicykle	Obec Haniska	30 000,00 €		EÚ zdroje Rozpočet obce	Počet stojísk (ks)		Projekt v realizácii. Prebieha výstavba 4 stojísk na bicykle. Fin. v rámci projektu "Vodozádržné opatrenia v obci Haniska".	P
3	Cyklotrasa Haniska - PP Haniska	Obec Haniska	1 230 000,00 €		P_SK Opatrenie - 2.8.2 Rozpočet obce	Celková dĺžka cyklistických kom.(km)		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov nositeľa projektu.	N
4	Cyklotrasa - EUROVELO	Obec Haniska	1 500 000,00 €		P_SK Opatrenie - 2.8.2 Rozpočet obce	Celková dĺžka cyklistických kom. (km)		Prebiehajú zmeny a doplnky ÚPN a príprava PD, ktorú zabezpečuje PSK.	P
SPOLU (1 - 4)			3 160 000,00 €						
PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu a udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky									
Špecifický cieľ: 1.1.2 Nastaviť systém energeticky efektívneho rozvoja									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Zníženie energetickej náročnosti obecných budov	Obec Haniska	80 000,00 €		Environmentálny fond Rozpočet obce	Odhad. ročné zníž. emisií sklen. plynov Podlahová plocha obnov. ver. budovy (m ²)		Projekt nebol zrealizovaný. Žiadosť o dotáciu bola podaná na Envirofond. Žiadosť bola zamietnutá.	N
SPOLU			80 000,00 €						
PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia									
Špecifický cieľ: 1.2.1 Nastaviť koncepčný prístup k ochrane prírody a krajiny, prevencii rizík a adaptácii na nepriaznivé zmeny klímy									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Zmeny a doplnky územného plánu obce v súvislosti s opatreniami na adaptáciu na zmenu klímy	Obec Haniska	20 000,00 €		Rozpočet obce	Počet spracovaných dokumentov (ks)		Prebieha realizácia projektu. Zmeny a doplnky ÚPN č.5 prebiehajú vo výške 5 842,50 €.	P
2	Rozšírenie kanalizácie obce Haniska	Obec Haniska	1 200 000,00 €	1 300,87 €	Rozpočet obce	Dĺžka vybudovanej kanalizácie (km)	0,10	Prebieha realizácia projektu. Vybudovaná 1. časť.	P



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia									
Špecifický cieľ: 1.2.1 Nastaviť koncepčný prístup k ochrane prírody a krajiny, prevencii rizík a adaptácii na nepriaznivé zmeny klímy									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
3	Rozšírenie vodovodu	Obec Haniska	200 000,00 €	1 487,90 €	Rozpočet obce	Dĺžka vybudovaného vodovodu (km)	0,18	Prebieha realizácia projektu. Vybudovaná 1. časť.	P
4	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	Obec Haniska	500 000,00 €		EÚ zdroje – MŽP SR Rozpočet obce	Vybudovaná infraštruktúra		Prebieha realizácia projektu. Budujú sa vodozádržné opatrenia na námestí pred obecným úradom - 82 225,29 €.	P
5	Príťažlivejšia Haniska	Obec Haniska	300 000,00 €		EÚ zdroje	Vytvorené al. obnov. otvorené priestr. v obci		Prebieha realizácia projektu. Realizuje sa výstavba kolumbiára -13 725 €.	P
SPOLU (1 – 5)			2 220 000,00 €	2 788,77 €					
PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia									
Špecifický cieľ: 1.2.2 Skvalitniť a zefektívniť systém nakladania s odpadom									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Manažment odpadov	Obec Haniska	100 000,00 €	2 184,00 €	Rozpočet obce	Počet nakúpených zberných nádob (ks)	23	Prebieha realizácia projektu. Nakúpené zberné nádoby - 23 ks.	P
SPOLU			100 000,00 €	2 184,00 €					
PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.1 Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre potreby trhu práce									
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zlepšiť kvalitu a podmienky pre predprimárne a primárne vzdelávanie									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Rozširovanie kapacít MŠ	Obec Haniska	300 000,00 €	71 877,00 €	Rozpočet obce	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ		Prebieha realizácia projektu - zateplenie MŠ, výmena okien, strechy, odvodnenie. Kapacita 21 detí nebola rozšírená.	P
SPOLU			300 000,00 €	71 877,00 €					
PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.1 Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre potreby trhu práce									
Špecifický cieľ: 2.1.2 Uľahčiť prístup na trh práce všetkým skupinám obyvateľov									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Rozšírenie chránenej dielne	Obec Haniska	200 000,00 €		MPSVaR SR Rozpočet obce			Prebieha príprava PD.	P
2	Zlepšenie podmienok existujúcej chránenej dielne	Obec Haniska	50 000,00 €		MPSVaR SR, PSK Rozpočet obce			Prebieha príprava projektovej dokumentácie.	P
SPOLU (1 – 2)			250 000,00 €						





PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu života									
Špecifický cieľ: 2.2.2 Vytvoriť podmienky pre zdravý životný štýl									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Zázemie športoviska	Obec Haniska	500 000,00 €	131 899,70 €	Fond na podporu športu Rozpočet obce	Podporená infraštruktúra	1	Projekt ukončený. Vybudované multifunkčné ihrisko 33x18 m.	S
SPOLU			500 000,00 €	131 899,70 €					
PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu života									
Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Bezpečnejšia obec	Obec Haniska	60 000,00 €	9 410,75 €	Rozpočet obce	Počet zakúpených bezp. kamier (ks)	5	Projekt ukončený.	S
SPOLU			60 000,00 €	9 410,75 €					
PRIORITA 3 - STRATEGICKÝ ROZVOJ A DOBRÉ SPRÁVOVANIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 3.2 Využiť potenciál územia pre ekonomický rozvoj									
Špecifický cieľ: 3.2.2 Rozvíjať potenciál pre kultúrny a kreatívny priemysel									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Obnova pamätníka na Furči a jeho okolia	Obec Haniska	50 000,00 €		EÚ zdroje PSK - Výzva pre región Rozpočet obce	Používatelia nových a vylepšených verejných inováčných služieb		Projekt nebol zrealizovaný z dôvodu nevysporiadaných majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom.	N
2	Haniska - obnova komunitných priestorov	Obec Haniska	30 000,00 €		P_SK - Opatrenie 5.1.5 Rozpočet obce	Používatelia nových a vylepšených verejných inováčných služieb		Prebieha spracovanie PD a príprava PZ.	P
SPOLU (1 – 3)			80 000,00 €						
Celkom (Priority 1 – 3)			6 750 000,00 €	218 160,22 €					



Obec Záborské

Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030
za obdobie rokov 2023 - 2025



OBEC ZÁBORSKÉ

Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 za obdobie rokov 2023 – 2025

Tabuľka 8 Kvantitatívne vyhodnotenie Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec Záborské


OBEC ZÁBORSKÉ							
Priorita	Špecifický cieľ	Počet intervencií*				Finančná náročnosť	
		Celkovo	Splnené	Priebežné plnenie	Nesplnené	Indikatívny rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2025
1 – ENVIRO Udržateľné a odolné prostredie	ŠC 1.1.1 - Doprava	11	0	7	4	10 047 000,00 €	1 452 584,60 €
	ŠC 1.1.2 - Energetika	1	0	1	0	1 200 000,00 €	0,00 €
	ŠC 1.2.1 - Klíma	7	0	4	3	3 640 000,00 €	30 998,00 €
	ŠC 1.2.2 - Odpad	1	0	0	1	50 000,00 €	0,00 €
	SPOLU	20	0	12	8	14 937 000,00 €	1 483 582,60 €
2 – ĽUDIA Služby pre dôstojný život	ŠC 2.1.1 - Vzdelávanie	1	1	0	0	563 980,00 €	523 416,46 €
	ŠC 2.1.2 - Práca	3	0	1	2	600 000,00 €	0,00 €
	ŠC 2.2.1 - Sociálne a zdravotnícke služby	1	0	1	0	1 000 000,00 €	0,00 €
	ŠC 2.2.2 - Šport	3	2	0	1	812 000,00 €	299 035,50 €
	ŠC 2.2.3 - Bezpečnosť	2	1	1	0	270 000,00 €	85 000,00 €
	SPOLU	10	4	3	3	3 245 980,00 €	907 451,96 €
CELKOM		30	4	15	11	18 182 980,00 €	2 391 034,56 €

Intervencia = konkrétna rozvojová aktivita / projekt


Obec Záborské v rokoch 2023 - 2025 **plánovala realizáciu celkom 30 rozvojových aktivít a projektov**. V sledovanom období 2023 - 2025 bolo **zrealizovaných celkom 13%** intervencií zameraných na zlepšenie služieb pre občanov a udržateľné životné prostredie. Rozšírená bola kapacita MŠ Včielka formou prístavby, vybudované boli detské inkluzívne ihrisko a parčík pre všetkých, rozšírené bolo verejné osvetlenie a prebehla aj rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov. Celková hodnota realizovaných projektov predstavuje viac ako 2,3 mil. €. **V štádiu rozpracovanosti je 50 % intervencií a 37 % intervencií sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať**, primárne z kapacitných a finančných dôvodov.



Graf 8 Prehľad plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec Záborské



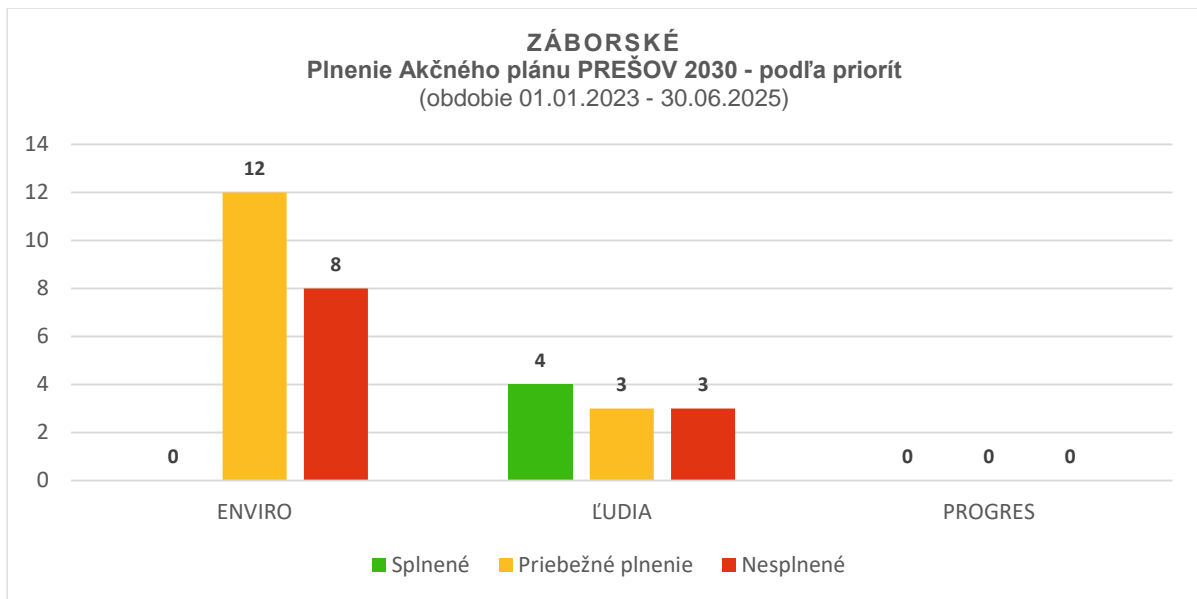


Graf 9 Percentuálne vyjadrenie plnenia plánovaných aktivít Akčného plánu PREŠOV 2030 - obec Záborské

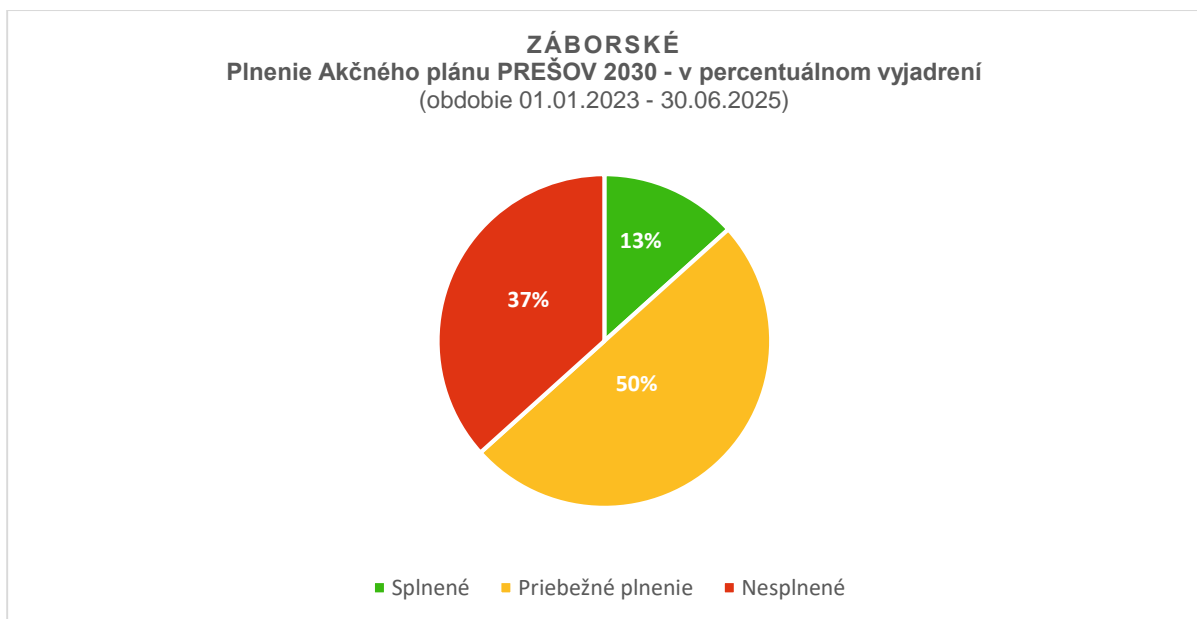

Obec Záborské sa venuje intenzívne aj príprave projektov, kde predpokladá čerpanie EÚ zdrojov v rámci Programu Slovensko, konkrétne ide o nasledovné projekty:

- Revitalizácia zelene v obci Záborské (aktuálne je už aj schválený NFP vo výške viac ako 200 tis. €),
- Polder - riešenie odtokových pomerov, ochrana obce pred záplavami (cca 400 tis. €)
- Cyklocesta IPZ/Záborské - I. etapa (cca 497 tis. €).





OBEC ZÁBORSKÉ

Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 - 2025 podľa prioritných oblastí

Tabuľka 9 Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 – 2025 podľa prioritných oblastí – obec Záborské

PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu a udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky									
Špecifický cieľ: 1.1.1 Vybudovať udržateľný model multimodálnej a ekologickej mobility									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov	Obec Záborské	1 300 000,00 €	944 993,80 €	Rozpočet obce	Dĺžka rekonštruovaných cestných komunikácií (km)	2,12	Zrekonštruované komunikácie a chodníky na úsekoch: Hlavná ulica, Nová ulica, Pri parku, Pri cintoríne a Petrovianska ulica.	P
						Dĺžka rekonštruovaných peších komunikácií (km)	2,91		
2	Rekonštrukcia poľnej cesty do Petrovian	Obec Záborské	500 000,00 €	385 730,80 €	Rozpočet obce	Dĺžka rekonštruovaných cestných komunikácií (km)	0,73	Zrekonštruovaný úsek medzi obcami Záborské a Petrovany	P
						Dĺžka rekonštruovaných peších komunikácií (km)	0,4		
3	Chodníky II. etapa	Obec Záborské	200 000,00 €	121 860,00 €	Rozpočet obce	Dĺžka miestnych komunikácií (km)	0,54	Zrealizovaný úsek - Prešovská ul., 0,54 km Prebieha realizácia v časti Ku ihrisku - 0,12 km v hodnote 32 434 €.	P
4	Chodníky III. etapa	Obec Záborské	1 200 000,00 €		Rozpočet obce	Dĺžka miestnych komunikácií (km)		Prebieha príprava projektovej dokumentácie	P
5	Stojiská na bicykle	Obec Záborské	100 000,00 €		Program rozvoja vidieka	Vybudované stojiská na bicykle (ks)	4	Vybudované stojiská: Oddychová zóna v strede obce - 4 ks Finančné zdroje na realizáciu v rámci projektu "Parčík pre všetkých".	P
6	Cyklocesta IPZ/Záborské, Cyklocesta IPZ – I. etapa	Obec Záborské	497 000,00 €		EÚ zdroje Rozpočet obce	Dĺžka cyklistických komunikácií (km)		Podaná žiadosť o NFP na Ministerstvo dopravy SR - opatrenie: Rozvoj infraštruktúry nízkoúhlíkovej dopravy, v celkovej hodnote 645 473,48 €.	P
7	Cyklocesta IPZ/Záborské, Cyklocesta IPZ – II. etapa	Obec Záborské	1 000 000,00 €		Plán obnovy a odolnosti Rozpočet obce	Dĺžka cyklistických komunikácií (km)		Projekt nebol zrealizovaný - nevyšporiadané majetkovo-právne vzťahy. Podarilo sa zrušiť tarchu MH - Invest. Potrebná aktualizácia projektu.	N
8	Cyklotrasa Haršaš	Obec Záborské	1 200 000,00 €		Plán obnovy a odolnosti Rozpočet obce	Dĺžka cyklistických komunikácií (km)		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov nositeľa projektu.	N
9	Cyklochodník Delňa	Obec Záborské	1 200 000,00 €		Rozpočet obce	Dĺžka cyklistických komunikácií (km)		Projekt nebol zrealizovaný - v rámci východného obchvatu mesta sa spracúvajú aj podklady a projekty na tento projekt (v súčasnosti prebiehajú geologické prieskumy kvôli možnosti napojenia na obec) - realizácia projektu bude súčasťou východného obchvatu.	N



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu a udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky									
Špecifický cieľ: 1.1.1 Vybudovať udržateľný model multimodálnej a ekologickej mobility									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
10	Cyklochodník - Okolo obce	Obec Záborské	2 800 000,00 €		Rozpočet obce	Dĺžka cyklistických komunikácií (km)		Vydané stavebné povolenie, spracovaná PD.	P
11	Nabíjacie stanice pre elektromobily	Obec Záborské	50 000,00 €		Plán obnovy a odolnosti	Vybudovaná infraštruktúra		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov.	N
SPOLU (1 – 11)			10 047 000,00 €	1 452 584,60 €					

PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.1 Podporiť dekarbonizáciu a udržateľnosť dopravnej infraštruktúry a energetiky									
Špecifický cieľ: 1.1.2 Nastaviť systém energeticky efektívneho rozvoja									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Zníženie energetickej náročnosti OcÚ	Obec Záborské	1 200 000,00 €		EÚ zdroje Environmentálny fond Rozpočet obce	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (tony CO ₂ ekv. / rok) Počet verejných budov na úrovni nízkoener. alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie		Podané projekty: 1. Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy OcÚ - podaný PZ IÚI na TS RP PSK v rámci P_SK - opatrenia 2.1.2. fin.náročnosť - 445 135 € (projekt je v zásobníku projektov RP PSK) 2. Zníženie energetickej náročnosti MŠ Včielky v obci Záborské - projekt podaný v rámci Environmentálneho fondu, fin. náročnosť - 627 323,45 € (zatiaľ nebol vydané stanovisko k projektu)	P
SPOLU			1 200 000,00 €						

PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia									
Špecifický cieľ: 1.2.1 Nastaviť koncepčný prístup k ochrane prírody a krajiny, prevencii rizík a adaptácii na nepriaznivé zmeny klímy									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Zmeny a doplnky územného plánu obce v súvislosti s opatreniami na adaptáciu na zmenu klímy	Obec Záborské	30 000,00 €		Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR Rozpočet obce	Počet spracovaných dokumentov (ks)		Priebieha zber požiadaviek od občanov.	P



PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia									
Špecifický cieľ: 1.2.1 Nastaviť koncepčný prístup k ochrane prírody a krajiny, prevencii rizík a adaptácii na nepriaznivé zmeny klímy									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
2	Rozšírenie vodovodu	Obec Záborské	500 000,00 €	30 998,00 €	Externé zdroje Rozpočet obce	Vybudovaná infraštruktúra		Zrealizované rozšírenie vodovodu v dĺžke 0,3 km na Poľnej ulici, fin. náročnosť 30 998 € (z toho 6 988 € obecné zdroje). Prebieha realizácia vežového vodovodu - predpokladaná fin. náročnosť 396 tis. €	P
3	Revitalizácia zelene	Obec Záborské	200 000,00 €		P_SK - Opatrenie 2.7.4 Rozpočet obce	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry (ks)		Podaná žiadosť o NFP v hodnote 236 369,99 € v rámci P_SK	P
4	Voda - náš poklad	Obec Záborské	210 000,00 €		Rozpočet obce	Vybudovaná infraštruktúra		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov nositeľa projektu.	N
5	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	Obec Záborské	800 000,00 €		EÚ zdroje Rozpočet obce	Vybudovaná infraštruktúra		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov nositeľa projektu.	N
6	Polder	Obec Záborské	400 000,00 €		P_SK - Opatrenie 2.4.1 Rozpočet obce	Vybudovaná infraštruktúra		Prebieha aktualizácia PD a príprava PZ IÚI v rámci P_SK, opatrenia 2.4.1.	P
7	Spoločné zariadenia	Obec Záborské	1 500 000,00 €		Rozpočet obce	Vybudovaná infraštruktúra		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov nositeľa projektu.	N
SPOLU (1 – 7)			3 640 000,00 €	30 998,00 €					

PRIORITA 1 - UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 1.2 Zlepšiť stav životného prostredia									
Špecifický cieľ: 1.2.2 Skvalitniť a zefektívniť systém nakladania s odpadom									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Manažment odpadov	Obec Záborské	50 000,00 €		Rozpočet obce	Počet zavedených riešení		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov nositeľa projektu.	N
SPOLU			50 000,00 €						



PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.1 Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre potreby trhu práce									
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zlepšiť kvalitu a podmienky pre predprimárne a primárne vzdelávanie									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Prístavba MŠ Včielky	Obec Záborské	563 980,00 €	523 416,46 €	IROP	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	100	Projekt ukončený - celkové rozšírenie kapacity MŠ o 100 detí predškolského veku.	S
SPOLU			563 980,00 €	523 416,46 €					

PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.1 Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre potreby trhu práce									
Špecifický cieľ: 2.1.2 Uľahčiť prístup na trh práce všetkým skupinám obyvateľov									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Priemyselný park Záborské II	Obec Záborské			Externé zdroje	Vybudovaná infraštruktúra		Projekt je v realizácii, predpokladaná fin. náročnosť 12 mil. €. Financované developerom.	P
2	Zriadenie obecného sociálneho podniku	Obec Záborské	300 000,00 €		EÚ zdroje Rozpočet obce	Počet vytvorených a udržaných pracovných miest		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov nositeľa projektu.	N
3	Chod obecného sociálneho podniku	Obec Záborské	300 000,00 €		MPSVaR SR Rozpočet obce	Počet vytvorených a udržaných pracovných miest		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov nositeľa projektu.	N
SPOLU (1 – 3)			600 000,00 €						

PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT									
STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu života									
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zabezpečiť dostupnosť kvalitných a integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre všetkých									
P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	Obec Záborské	1 000 000,00 €		EÚ zdroje Rozpočet obce			V štádiu projektovej prípravy.	P
SPOLU			1 000 000,00 €						





PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu života

Špecifický cieľ: 2.2.2 Vytvoriť podmienky pre zdravý životný štýl

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Detské inkluzívne ihrisko	Obec Záborské	222 000,00 €	202 800,00 €	IROP - REACT, MPSVaR SR Rozpočet obce	Podporená infraštruktúra	1	Projekt ukončený.	S
2	Parčík pre všetkých	Obec Záborské	90 000,00 €	96 235,50 €	Program rozvoja vidieka	Podporená infraštruktúra	1	Projekt ukončený.	S
3	Športovo - relaxačná zóna	Obec Záborské	500 000,00 €		EÚ zdroje Rozpočet obce	Podporená infraštruktúra		Projekt nebol zrealizovaný z kapacitných a finančných dôvodov nositeľa projektu.	N
SPOLU (1 – 3)			812 000,00 €	299 035,50 €					

PRIORITA 2 - SLUŽBY PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT

STRATEGICKÝ CIEĽ: 2.2 Zabezpečiť dostupnú infraštruktúru, kvalitu služieb a podmienky pre vyššiu života

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov

P.č.	Názov projektu	Nositeľ / Gestor projektu	Finančná náročnosť			Výstup		Poznámka	Stav
			Plán	Skutočnosť	Zdroj	Názov	Hodnota		
1	Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia	Obec Záborské	120 000,00 €	85 000,00 €	Rozpočet obce	Počet rozšírených a zrekonštruovaných verejných osvetlení (ks)	115 2 RVO	Projekt ukončený v spolupráci s VSE.	S
2	Bezpečnejšia obec	Obec Záborské	150 000,00 €		Rozpočet obce	Podporená infraštruktúra		Prebieha aktualizácia PD, vrátane nových častí IBV.	P
SPOLU (1 – 2)			270 000,00 €	85 000,00 €					
CELKOM (Priority 1 – 2)			18 182 980,00 €	2 391 034,56 €					



ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

Tabuľka 10 Zoznam použitých skratiek

Zoznam použitých skratiek	Význam
AK UMR	Administratívne kapacity udržateľného mestského rozvoja
BD	Bytový dom
CDS	Cestná dopravná signalizácia
CNG	Stlačený zemný plyn - alternatívne palivo pre spaľovacie motory
COV	Celkové oprávnené výdavky
ČOV	Čistička odpadových vôd
DHZM Prešov	Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov
DoV	Dopytovo orientovaná výzva
DPH	Daň z pridanej hodnoty
DPMP, a.s.	Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
DRS	Dokumentácia pre realizáciu stavby
DUR	Dokumentácia pre územné rozhodnutie
ECAV	Evanjelická cirkev augsburského vyznania
EF	Environmentálny fond
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
ESF	Európsky sociálny fond
EÚ	Európska únia
FC	Futbalový klub
FTA, s.r.o,	Futbal Tatran Aréna, spoločnosť s ručením obmedzeným
GKA Prešov	Gréckokatolícka cirkev Prešov
IBV	Individuálna bytová výstavba
IDS	Integrovaný dopravný systém
IoT	Internet vecí
IPZ	Industriálny park Záborské
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IÚS	Integrovaná územná stratégia
KPM	Kancelária primátora mesta
KR UMR	Kooperačná rada UMR Prešov
MD SR	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MHD	Mestská hromadná doprava
MIP	Mestské inovačné partnerstvo
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MIS	Mestská inovačná stratégia
MK	Miestna komunikácia
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MOPS	Miestna občianska poriadková služba








Zoznam použitých skratiek	Význam
MPS, s.r.o	Mestský podnik služieb, spoločnosť s ručením obmedzeným
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MRK	Marginalizované rómske komunity
MsP	Mestská polícia Prešov
MsZ	Mestské zastupiteľstvo
MŠ	Materská škola
MŠVVaŠ SR	Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
MVO	Mimovládne organizácie
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
n. o.	Nezisková organizácia
NDS, a.s.	Národná diaľničná spoločnosť, akciová spoločnosť
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NIVAM	Národný inštitút vzdelávania a mládeže
NKP	Národná kultúrna pamiatka
NP	Národný projekt
OcÚ	Obecný úrad
OD	Odbor dopravy
OHA	Odbor hlavného architekta
OISaS	Odbor informačných systémov a stratégií
ORA	Odbor rozvojových aktivít
OSS	Odbor sociálnych služieb
OŠKaCR	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu
OZE	Obnoviteľné zdroje energie
OŽP	Odbor životného prostredia
P	Priorita
P_SK	Program Slovensko
PD	Projektová dokumentácia
PDO	Plán dopravnej obslužnosti
PHZ	Predpokladaná hodnota zákazky
PM	Parkovacie miesto
POO	Plán obnovy a odolnosti SR
PP	Priemyselny park
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PPM	Poskytnutie prostriedkov mechanizmu
PSK	Prešovský samosprávny kraj
PZ IÚI	Projektový zámer integrovanej územnej investície
R4	Rýchlostná cesta R4





Zoznam použitých skratiek	Význam
RIA mesta Prešov, n.o.	Rozvojová implementačná agentúra mesta Prešov, nezisková organizácia
RKC	Rímskokatolícka cirkev
RP PSK	Rada partnerstva PSK
RVO	Rozvádzač pre verejné osvetlenie
SAD	Slovenská autobusová doprava
SAŽP	Slovenská agentúra životného prostredia
SC	Strategický cieľ
SHMÚ	Slovenský hydrometeorologický ústav
SP	Stavebné povolenie
SR	Slovenská republika
SSZ	Svetelná signalizácia
SÚC PSK	Správa a údržba ciest PSK
ŠC	Špecifický cieľ
ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
TPP	Trvalý pracovný pomer
TS RP PSK	Technický sekretariát Rady partnerstva PSK
TSmP, a.s.	Technické služby mesta Prešov, akciová spoločnosť
UMR	Udržateľný mestský rozvoj
ÚPN	Územný plán
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
VO	Verejné obstarávanie
VOD	Verejná osobná doprava
Z. z.	Zbierka zákonov
ZKO	Zmesový komunálny odpad
ZoD	Zmluva o dielo
ZpS	Zariadenie pre seniorov
ZŠ	Základná škola
ZUŠ	Základná umelecká škola
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽSR	Železnice Slovenskej republiky





ZOZNAM OBRÁZKOV, TABULIEK A GRAFOV

Obrázky

Obrázok 1 Priority a ciele	2
Obrázok 2 Mapa projektov	5

Tabuľky

Tabuľka 1 Prehľad schválených projektových zámerov integrovaných územných investícií k 30.06.2025	6
Tabuľka 2 Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – mesto Prešov	9
Tabuľka 3 Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 – 2025 podľa prioritných oblastí – mesto Prešov	11
Tabuľka 4 Kvantitatívne vyhodnotenie Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec L'ubotice.....	32
Tabuľka 5 Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 – 2025 podľa prioritných oblastí – obec L'ubotice	34
Tabuľka 6 Kvantitatívne vyhodnotenie plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec Haniska	39
Tabuľka 7 Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 – 2025 podľa prioritných oblastí – obec Haniska	41
Tabuľka 8 Kvantitatívne vyhodnotenie Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec Záborské	44
Tabuľka 9 Stručné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2023 – 2025 podľa prioritných oblastí – obec Záborské	46
Tabuľka 10 Zoznam použitých skratiek	51

Grafy

Graf 1 Plnenie Akčného plánu PREŠOV 2030 k 30.06.2025	4
Graf 2 Prehľad plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – mesto Prešov	10
Graf 3 Percentuálne vyjadrenie plnenia plánovaných aktivít Akčného plánu PREŠOV 2030 – mesto Prešov	10
Graf 4 Prehľad plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec L'ubotice	33
Graf 5 Percentuálne vyjadrenie plnenia plánovaných aktivít Akčného plánu PREŠOV 2030 – obec L'ubotice	33
Graf 6 Prehľad plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec Haniska	40
Graf 7 Percentuálne vyjadrenie plnenia plánovaných aktivít Akčného plánu PREŠOV 2030 – obec Haniska	40
Graf 8 Prehľad plnenia Akčného plánu PREŠOV 2030 podľa prioritných oblastí – obec Záborské	45
Graf 9 Percentuálne vyjadrenie plnenia plánovaných aktivít Akčného plánu PREŠOV 2030 - obec Záborské.....	45





 **PREŠOV
2030**
